


# Bauliche Vorbereitung



## Skimmerpools **QBIG BENEFIT**

Version: 27.02.2024 / Revision: 27.02.2024  
L. V.

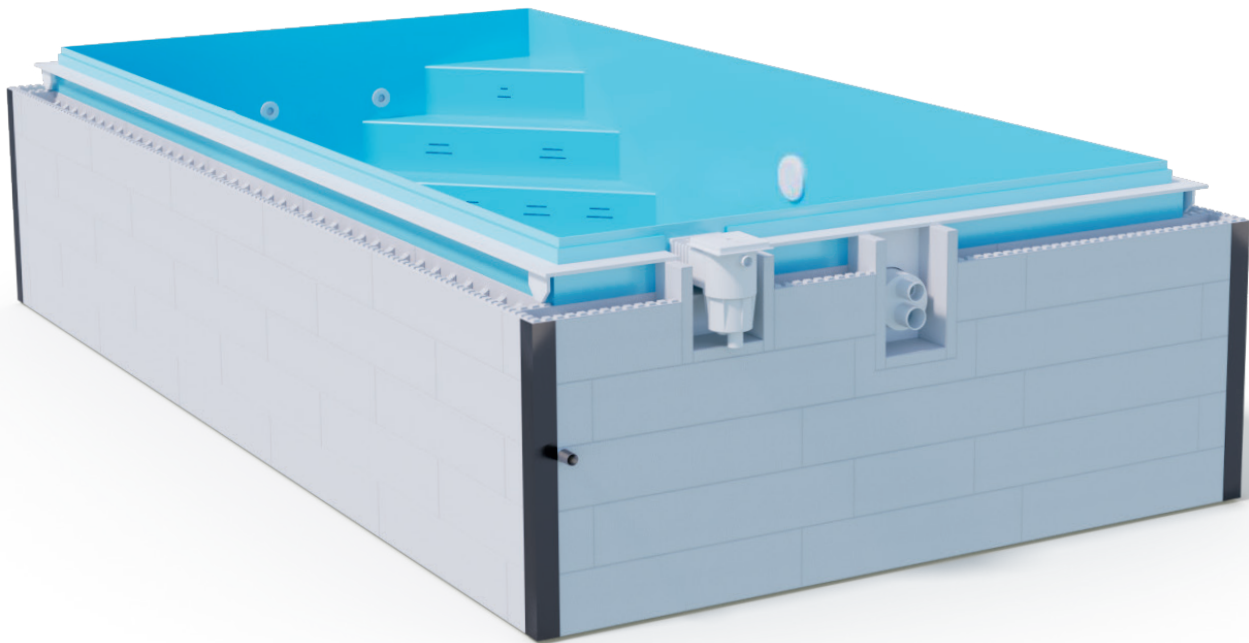

[www.ALBIXON.de](http://www.ALBIXON.de)

<b>1.</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Vermessen und Bodenaushub</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>Ebenen des Baugrubenbodens und Entwässerung der Bodenplatte</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Betonieren der Bodenplatte</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>Meldung der baulichen Vorbereitung</b>	<b>12</b>
<b>6.</b>	<b>Aufsetzen des Poolskeletts und Montage der Pooltechnologie</b>	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b>Verstrebung des Pools und anschließendes Umschütten mit Erde</b>	<b>14</b>
<b>8.</b>	<b>Betonieren der Thermokonstruktion</b>	<b>16</b>
<b>9.</b>	<b>Herstellung der Untergrundplatte für die Endoberfläche</b>	<b>18</b>
<b>10.</b>	<b>Formular</b>	<b>22</b>
<b>11.</b>	<b>Stromleitungen</b>	<b>24</b>
<b>12.</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>31</b>

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns über unseren Kundendienst zu kontaktieren. Wir sind für Sie da.

Kundendienst-Telefonnummer: 477 07 07 11  
[www.ALBIXON.de](http://www.ALBIXON.de)

1. Grundrissmarkierung der Form des Pools.
2. Tiefe der Grube.
3. Vorbereitung für die Platzierung der sonstigen Technologie.

Die richtigen Maße der Baugrube entnehmen Sie bitte der schematischen Zeichnung, die Bestandteil des Werkvertrages ist. Lassen Sie sich von einem Bauexperten schriftlich bestätigen, dass die Platzierung am vorgesehenen Ort baulich machbar ist und keine Leitungen in dem Grundstück verlaufen, die zur Kollision führen können. Der Standort des Pools muss der Norm IEC 60364-7-702:2010 entsprechen.

## 1. Grundrissmarkierung des Pools

### Breite und Länge der Grube für den Pool


Breite und Länge der Grube für den Pool, wenn der Pool mit einem Kran gesetzt wird = +250 mm zu jeder Seite von dem Außenmaß des Pools. Außenmaße sind einschließlich der Breite der Thermokonstruktion angegeben. Die Grundrissdarstellung auf der nächsten Seite zeigt diese Abmessungen unter Punkt S1 und L1

### Breite und Länge der Grube für Technischächte

Breite und Länge der Grube für Technischächte = +600 mm vom Außendurchmesser des Schachts oder seiner äußeren Breite und Länge.

Beispiel:	Außendurchmesser des Schachts	1 265 mm
	Maß der Grube	1 865 x 1 865 m


### Grundriss der Grube für den Pool und den Technischacht (Einheiten in mm)

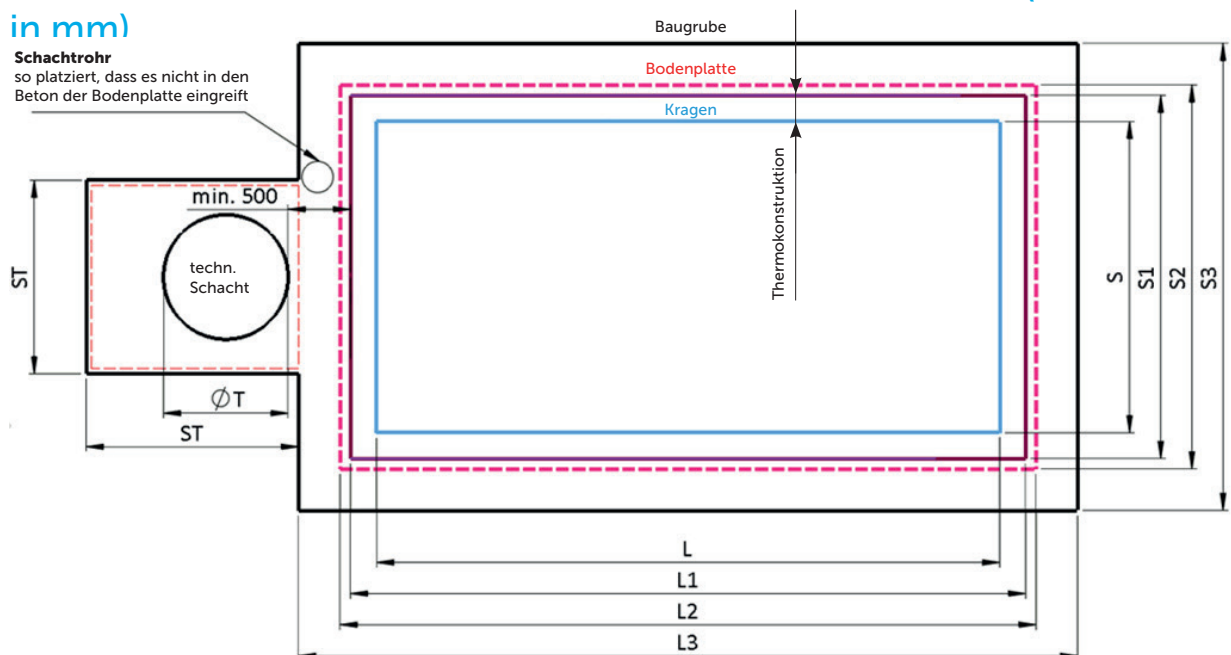

# 2.

## Vermessen und Bodenaushub

### Grundriss der Baugrube für den Pool mit dem Schacht der Gegenstromanlage

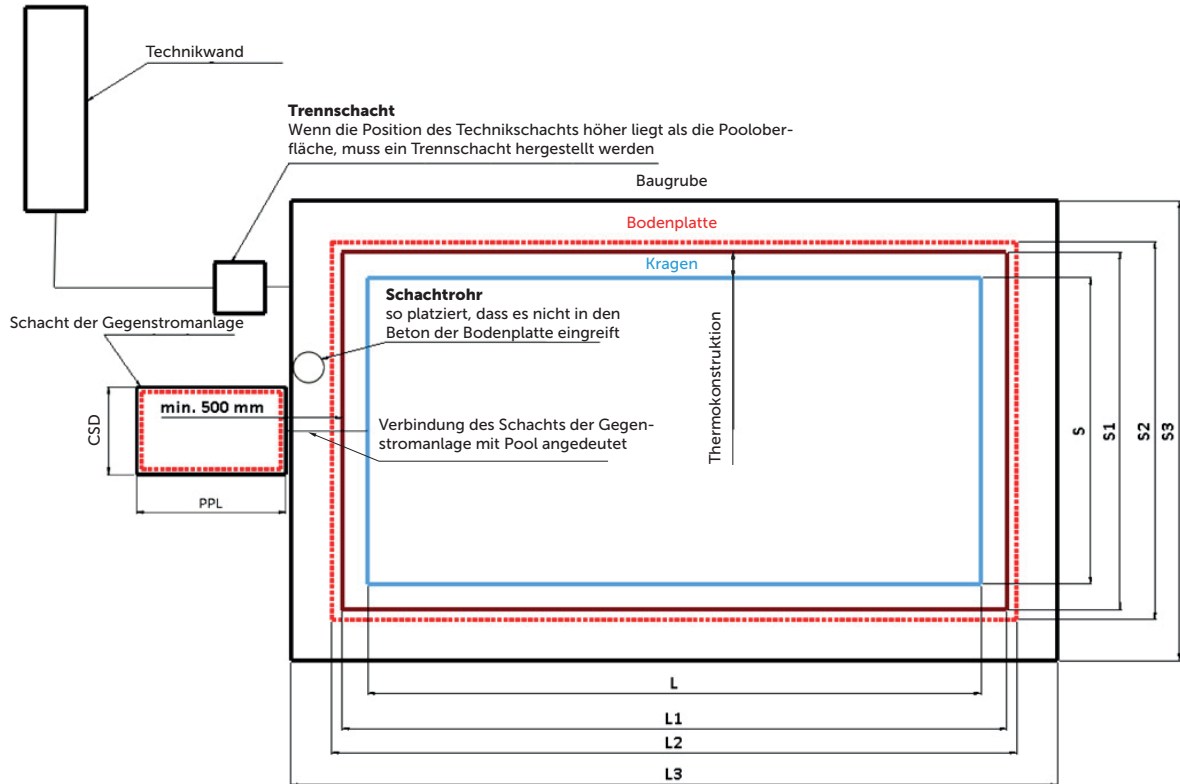

L	Poollänge	5 000 mm	6 000 mm	7 000 mm	8 000 mm
L1	Pool-Außenlänge	5 500 mm	6 500 mm	7 500 mm	8 500 mm
L2	Länge der Bodenplatte	5 700 mm	6 700 mm	7 700 mm	8 700 mm
L3	Länge der Grube	6 000 mm	7 000 mm	8 000 mm	9 000 mm

S	Poolbreite	3 000 mm	3 500 mm	4 000 mm
S1	Pool-Außenbreite	3 500 mm	4 000 mm	4 500 mm
S2	Breite der Bodenplatte	3 700 mm	4 200 mm	4 700 mm
S3	Breite der Grube	4 000 mm	4 500 mm	5 000 mm

CSD	Maß der Grube für den Schacht der Gegenstromanlage	1 050 mm
PPL	Maß der Grube für den Schacht der Technikwand	1 650 mm


ST	Maß der Grube für den Technikschacht	für Schacht mit 1.200 mm Durchmesser ST = 1.865 mm
		für Schacht mit 1.500 mm Durchmesser ST = 2.165 mm

### Markierung der Form des Pools.

Den Bereich für die Platzierung des Pools je nach Typ und Abmessungen des Pools markieren (mit Sand, Kalk). Alle Messungen und die Positionierung des Pools sollten mit größter Sorgfalt und im Hinblick auf die Fertigstellungsarbeiten des Pools (Pflasterung usw.) durchgeführt werden.

## 2. Tiefe der Grube – Berechnung.

Die Tiefe der Grube für den Pool und der Grube für die Installation des Technikschafts ist entsprechend den Berechnungen unten zu bestimmen. Zuerst ist die Gesamttiefe der Baugrube für den Pool festzulegen. Als Zweites muss die Tiefe der Grube für die Installation des Technikschafts (des Schachts der Gegenstromanlage) ermittelt werden. Als Drittes ist die Höhe der Stufe (E) für die richtige Platzierung des Technikschafts zu bestimmen. Vergessen Sie nicht, den Unterschied zum Gelände (U) korrekt einzutragen. Der „U“-Wert ergibt direkt die endgültige Höhe des kompletten Poolbaus, weshalb alle danach durchzuführenden Bauschritte (höhere Pflasterung, Versenken oder Anheben des Pools usw.) berücksichtigt werden müssen. Stellen Sie die Oberkante des Technikschafts mindestens 40 mm (F) über die Endoberfläche, die um den Pool herum hergestellt wird (es ist darauf zu achten, dass eine Kollision mit der Überfahrt von der Überdachung her vermieden wird). Dies dient zum Schutz des Schachts vor Niederschlagswasser. Wenn Sie den Schacht nicht über dem Niveau der Endoberfläche installieren möchten, dann muss um den Schacht eine entsprechende Entwässerung von Niederschlagswasser ausgeführt werden. Der Schacht kann nicht im Bereich der künftigen Schienenanlage platziert werden. Der Schachtboden ist absichtlich nicht wärmeisoliert, damit der Schacht im Winter durch die Erdwärme „aufgeheizt“ wird.

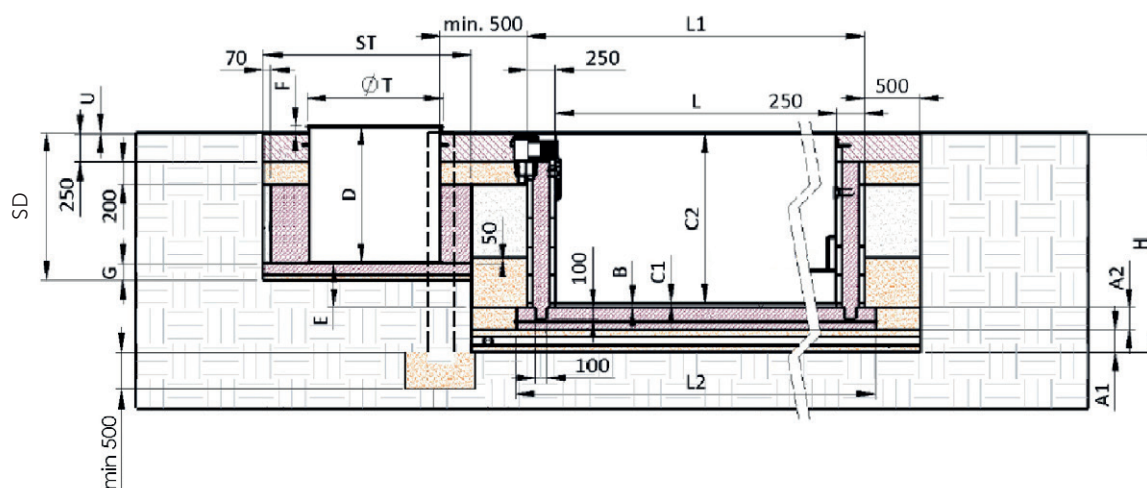

A1	Kiesbett mit Drainagerohren	200 mm
A2	Betonbodenplatte mit Bewehrungsmatte	200 mm
B	Bodenisolierung (extrudiertes Polystyrol)	30 mm
C1	Poolboden-Dicke	8 mm oder 6 mm
C2	Tiefe des Pools	je nach Pooltyp
D	Gesamttiefe des Technikschafts / des Schachts der Gegenstromanlage	Technikschaft = 1.213 mm Schacht der Gegenstromanlage = 796 mm
E	Überhöhung der Pool-Bodenplatte und der Schacht-Bodenplatte	$(H + F) - (A1 + A2 + D)$
F	vom Hersteller vorgegebene Überhöhung des Technikschafts	40 mm
G	Beton plus Kies (Kies 50 mm; Beton 100 mm)	150 mm
H	Tiefe der Grube für den Pool	$A1 + A2 + B + C1 + C2 + (\pm U)$
SD	Tiefe der Grube für den Schacht	$(D - F) + G + (\pm U)$
U	Tiefe Pflasterplatten / Steinteppich / Pool-Einsenkung	je nach Typ

### Ausführung von Bodenaushub und Sicherung der Umfassungswände.

Aushub und Sicherung der Umfassungswände der Baugrube (falls aufgrund geologischer Gegebenheiten erforderlich) sollen nur von einer Fachfirma durchgeführt werden. Der Bodenaushub kann auch für die Landschaftsgestaltung der Umgebung verwendet werden, weshalb nicht sämtlicher Bodenaushub abtransportiert werden muss. Die Gestaltung der Umgebung wird mit Rücksicht auf den neuen Körper des Pools durchgeführt, sie ist nicht immer erforderlich.



#### Wichtiger Hinweis:

Der Auftragnehmer ist für die Sicherung der Wände der ausgehobenen Grube verantwortlich.


Die obigen Beschreibungen und Berechnungen gelten für die Standardposition des Technischachts – siehe Grundriss der Grube.

#### Hinweis:

Erwägen Sie den eventuellen Anschluss an das Abwassersystem des jeweiligen Objektes gleichzeitig mit den Aushubarbeiten. Dadurch ist es dann möglich, die Drainagepumpe und die Pooltechnologie direkt an die Abwasserableitung anzuschließen, was Ihnen mehr Komfort bei der Poolwartung, beim Ablassen von Wasser aus der Filtration usw. bietet (Prüfen Sie immer die Möglichkeit des Anschlusses des Pools an das Abwassersystem gemäß den örtlichen Abwasservorschriften).

### Die folgenden Arten von Technischächten können Gegenstand des Werkvertrags sein:


- Technischacht mit Deckel zum Einbau der Filtration (Ø 1.200 Höhe 1.200 mm)
- Technischacht mit Deckel zum Einbau der Filtration und Gegenstromanlage (Ø 1.500 Höhe 1.200 mm)
- Technischacht mit Deckel zum Einbau der Gegenstromanlage (1.200 x 600 x 800 mm) = L / B / H

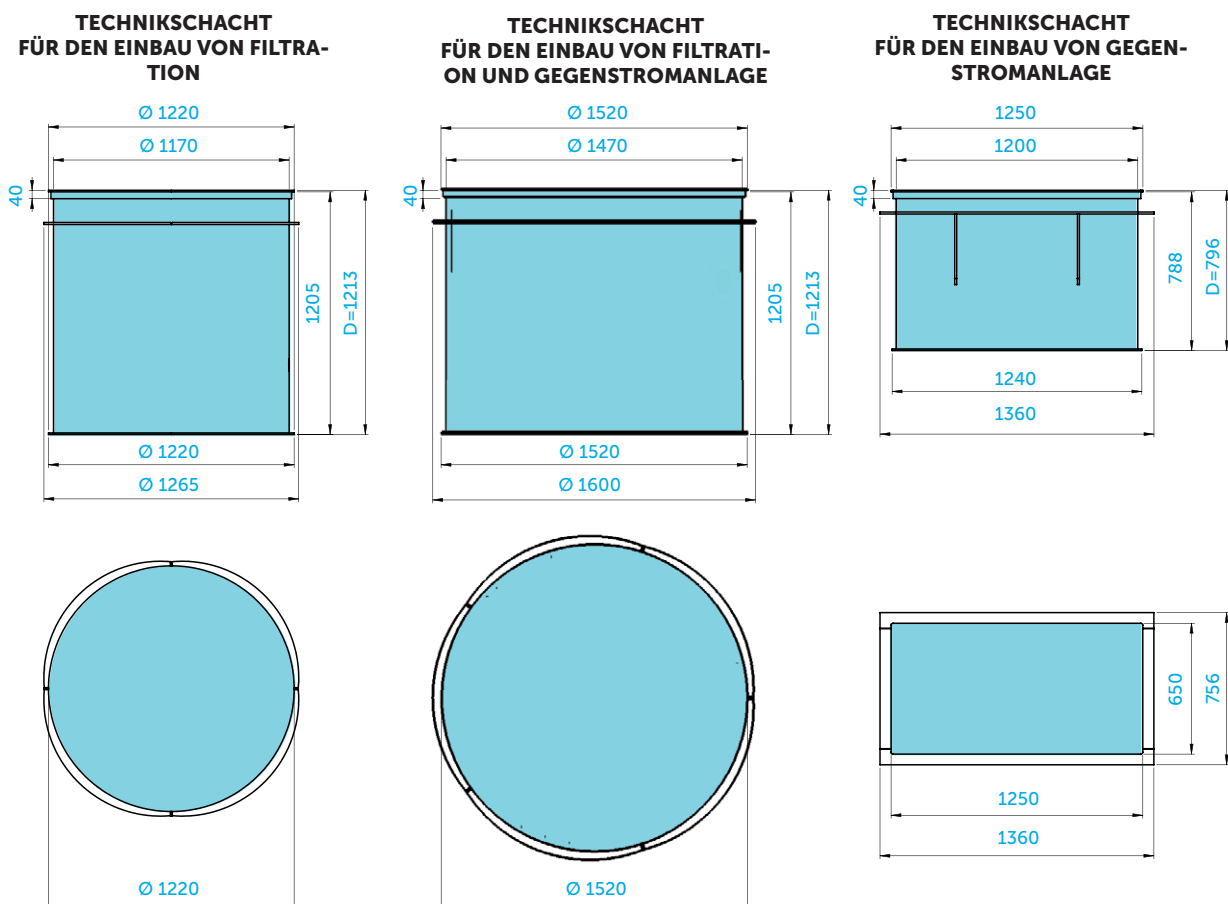

## Vorbereitung für die Platzierung der sonstigen Pooltechnologie.

Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz der Technologie ist die Verwendung der ALBIXON-Technikwand. Die Pooltechnik sollte so installiert werden, dass der Zugang für Unbefugte und Kinder verhindert wird. Die Installation hat in einer Umgebung zu erfolgen, in der die Luftfeuchtigkeit den Anforderungen des Standorts der elektrischen Komponenten entspricht.


Wenn den Technikwände über der Pooloberfläche installiert werden soll, muss ein separater Versickerungsschacht (Trennschacht) hergestellt werden, der zum Ablassen des Wassers aus der Rohrleitung für die Winterperiode dient. Dieser Schacht sollte Mindestabmessungen von 500 x 500 mm (je nach Tiefe anzupassen), eine Tiefe je nach Leitungsführung, jedoch immer solche Abmessungen haben, dass die Rohrleitung bei Bedarf bequem getrennt werden kann und das Wasser abfließt. Position der Trennverschraubung siehe Abbildung. Die Trennung muss am tiefsten Punkt erfolgen.

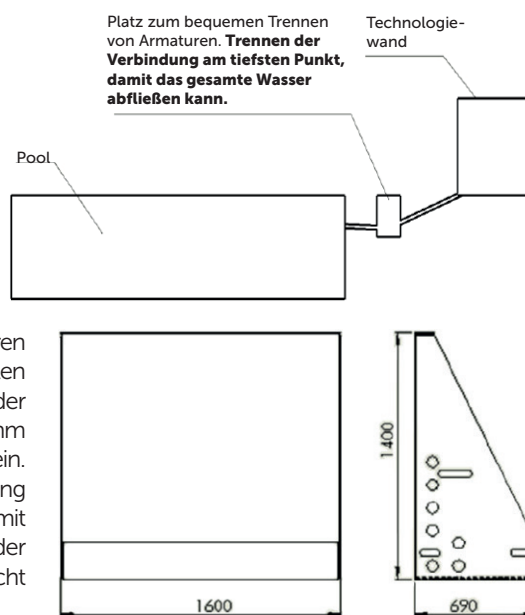

**Technologiewand** (links, rechts) – eine technologische Einheit für die Unterbringung im Technikraum bzw. in einem anderen geeigneten Gartengebäude. Die Wand muss auf einem horizontalen und ausreichend festen Untergrund stehen. Von der Seite der Ableitungen (linke oder rechte Version) müssen mindestens 500 mm Platz für den Anschluss und weitere Handhabung vorhanden sein. Um die Pooltechnologie und den Pool ggf. mit einer externen Heizung zu verbinden, sind Rohrverlegungswege und Durchführungen mit entsprechender Größe ( $\varnothing$  Rohr + Isolierung) in den Raum mit der untergebrachten Technologie vorzubereiten (dies gilt auch für nicht standardmäßig montierte Technologie).

**Gegenstromanlage** – Installation separat im Schacht der Gegenstromanlage oder im Technikschat – Schächte mit Gegenstromanlage mit der Rohrleitung der Gegenstromanlage in der Poolachse platzieren, wo sich die Auslässe der Maske der Gegenstromanlage befinden. Dadurch werden die geringsten Leistungsverluste erzielt. Der maximale Abstand zum Außenriss des Poolskeletts beträgt 2.000 mm. Wenn die Gegenstromanlage außerhalb der Achse des Poolskeletts angeordnet wird, wird ihre Leistung geringer.

**Wärmepumpe** – um die Pooltechnologie und die Wärmepumpe zu verbinden, müssen Wege für die Verlegung der Verbindungsleitung hergestellt werden (Aushubbreite mind. 200 mm, Rohrneigung  $1.5^\circ$  über die gesamte Länge zum Trennschacht). Um die Wärmepumpe und die Technologiewand zu verbinden, müssen am tiefsten Punkt der Rohrleitung Trennmöglichkeiten für die Wasserableitung vorgesehen werden. Die Bodenplatte der Wärmepumpe muss ausreichend fest und waagrecht sein. Ein Betonfundament mit 200 mm Höhe ist zu errichten. Legen Sie das Fundament auf ein Kiesbett der Fraktion 8/16, das auf eine nicht gefrorene Tiefe\*\* verdichtet ist. Die Grundrissabmessungen des Fundaments sollten auf jeder Seite mindestens 40 mm größer sein als die Außenabmessungen der Wärmepumpe. Für die Wärmepumpenleitung empfehlen wir Verlegung in Erde in einer Tiefe von 30-50 cm. Die Wärmepumpe an einem geräumigen, sonnigen Ort mit guter Lüftung aufstellen. Ihre Position muss eine reibungslose Luftzirkulation ermöglichen, siehe Anleitung zur jeweiligen Wärmepumpe. Die Wärmepumpe kann durch ihren Betrieb auch eine beträchtliche Menge an Wasserkondensat erzeugen. Deshalb muss mit seinem Auftreten und seiner Ableitung gerechnet werden. Stellen Sie sicher, dass sich die Anlage nach der Installation in einer aufrechten Position ohne Neigung befindet. Stellen Sie die Maschine nicht an einem Ort auf, an dem Verunreinigungen, korrosive Gase auftreten und sich Schmutz oder heruntergefallenes Laub ansammelt. Der Aufstellungsort darf nicht in der Nähe von entzündlicher oder explosionsfähiger Atmosphäre mit allgemeiner Brandgefahr liegen. Beachten Sie bitte die Abstände zu Hindernissen in Übereinstimmung mit der jeweiligen Anleitung zur Wärmepumpe. Installieren Sie die Wärmepumpe mind. 3.500 mm von der Poolkante (nach ČSN 33 2000-7-702) und innerhalb einer Entfernung von 7.500 mm von der Pooltechnologie und bis zu 1.000 mm Höhenunterschied zwischen der Wasseroberfläche im Pool und der Unterkante der Wärmepumpe.

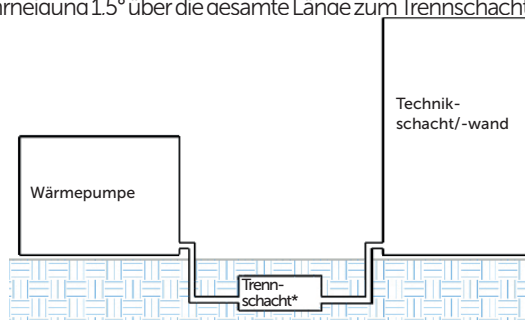

\* Wenn die gesamte Länge der Rohrleitung zur Filteranlage hin geneigt ist, ist kein Trennschacht erforderlich.


\*\* Die frostfreie Tiefe ist die Tiefe unter der Geländeoberfläche im Außenbereich, in der der Boden auch während der kalten Jahreszeit nicht gefriert. In der Tschechischen Republik gilt in der Bauindustrie je nach Standort und Bodenart ein Niveau von 80 – 140 cm unter der Oberfläche als frostfreie Tiefe.

# 3.

## Ebenen des Baugrubenbodens und Entwässerung der Bodenplatte


### 1. Installation des Erdungsbands und des Drainagesets (des Schachtrohrs) 1. Phase.

Auf dem Boden, am Umfang der Grube muss ein Erdungsband gemäß den geltenden Normen installiert werden. Weitere Informationen zu elektrischen Leitungen finden Sie im Abschnitt Stromleitungen.

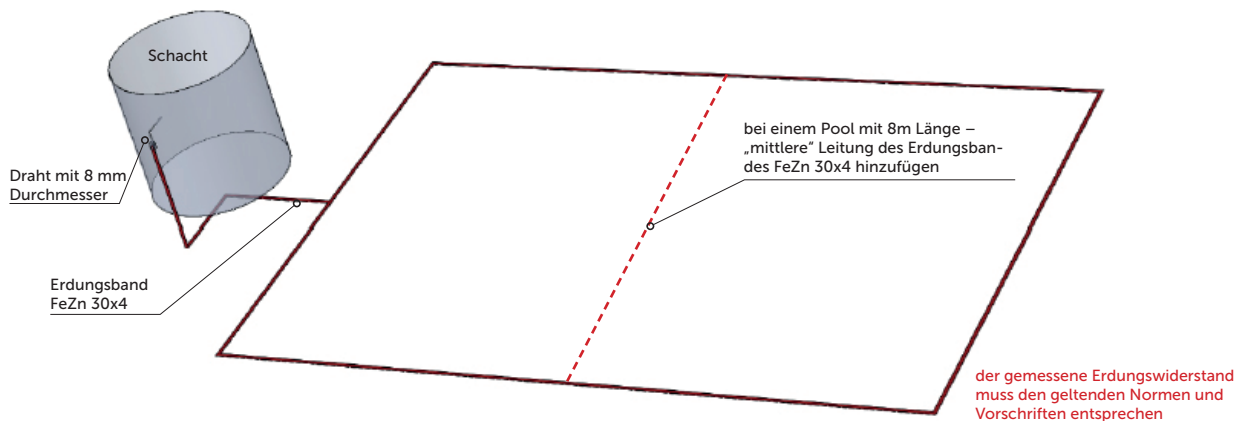

Die Bodenplatte muss permanent entwässert werden. Für eine ordnungsgemäße Entwässerung der Bodenplatte muss ein Drainagerohr unter der Bodenplatte installiert werden, das mit dem Drainageset (Schachtrohr der Drainagepumpe + Drainagepumpe dauerhaft an die Stromversorgung angeschlossen, siehe nächster Absatz) verbunden ist. Fragen Sie Ihre Baufirma nach der idealen Lösung für die Entwässerung der Bodenplatte des Pools und etwaiger Schächte entsprechend den örtlichen geologischen Gegebenheiten. Achten Sie jedoch darauf, dass nicht nur das Grundwasser, sondern auch das Niederschlagswasser berücksichtigt wird, das sich auf das gesamte Poolskelett genauso negativ auswirken kann wie das Grundwasser.

**Entwässerungsschacht** – ein senkrecht zur Bodenplatte angeordnetes Rohr mit ca. 300 mm Durchmesser. Auf den Boden dieses Rohrs Kies mit einer Körnung (Fraktion) von 8/16 schütten. Zwischen diesem Kies und der endgültigen Höhenlage der Poolbodenplatte muss ein Höhenunterschied von mindestens 500 mm bestehen. Das Drainageset (Rohr) dient als Wasserspeicher zur Grundwasser- und Regenwasseransammlung und muss mit einer Tauchpumpe ausgestattet werden. Diese Pumpe muss automatisch eingeschaltet werden, wenn der Wasserstand im Drainageset ansteigt, und muss ständig über ein Erdungskabel mit der Stromversorgung verbunden sein. Das Zuleitungskabel muss vom Hausverteilerkasten angeschlossen werden, es darf nicht über den Schaltkasten im Technischacht angeschlossen werden. Das gepumpte Wasser muss aus dem Poolbereich abfließen und darf nicht unter den Pool zurückfließen.

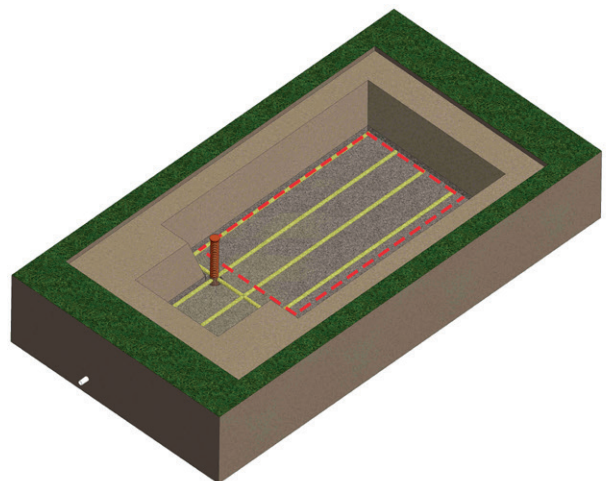

### 2. Verschütten mit Kies und Installation der Drainagerohrleitung 2. Phase.

Kies mit Körnung (Fraktion) 8/16 und einer Höhe von ca. 100 mm auf dem Boden der Grube verteilen. Drainagerohrleitung  $\varnothing$  80 mm mit einer Neigung zum Wasserentwässerungspunkt (Drainageset) in der Kiesschicht verlegen. Die Drainagerohrleitung muss mit einem Gefälle von mindestens 1% zum Wasserentwässerungspunkt (Schachtrohr der Drainagepumpe) verlegt werden. Die Drainagerohre sollten nicht mehr als 800 mm voneinander entfernt sein.

Vor Abdeckung mit Schotter und danach mit Beton muss die komplette Drainagerohrleitung mit einer Geotextile verdeckt werden.




# Ebenen des Baugrubenbodens und Entwässerung der Bodenplatte

## 3.

### 3. Abschließende Verschüttung mit Kies 3. Phase.

Auf die erste Kiesschicht mit der verlegten Drainageleitung eine weitere ca. 100 mm dicke Kiesschicht (Körnung 8/16) auftragen. Der Kies muss ausreichend verdichtet werden – achten Sie jedoch darauf, die Drainageleitung nicht zu beschädigen.

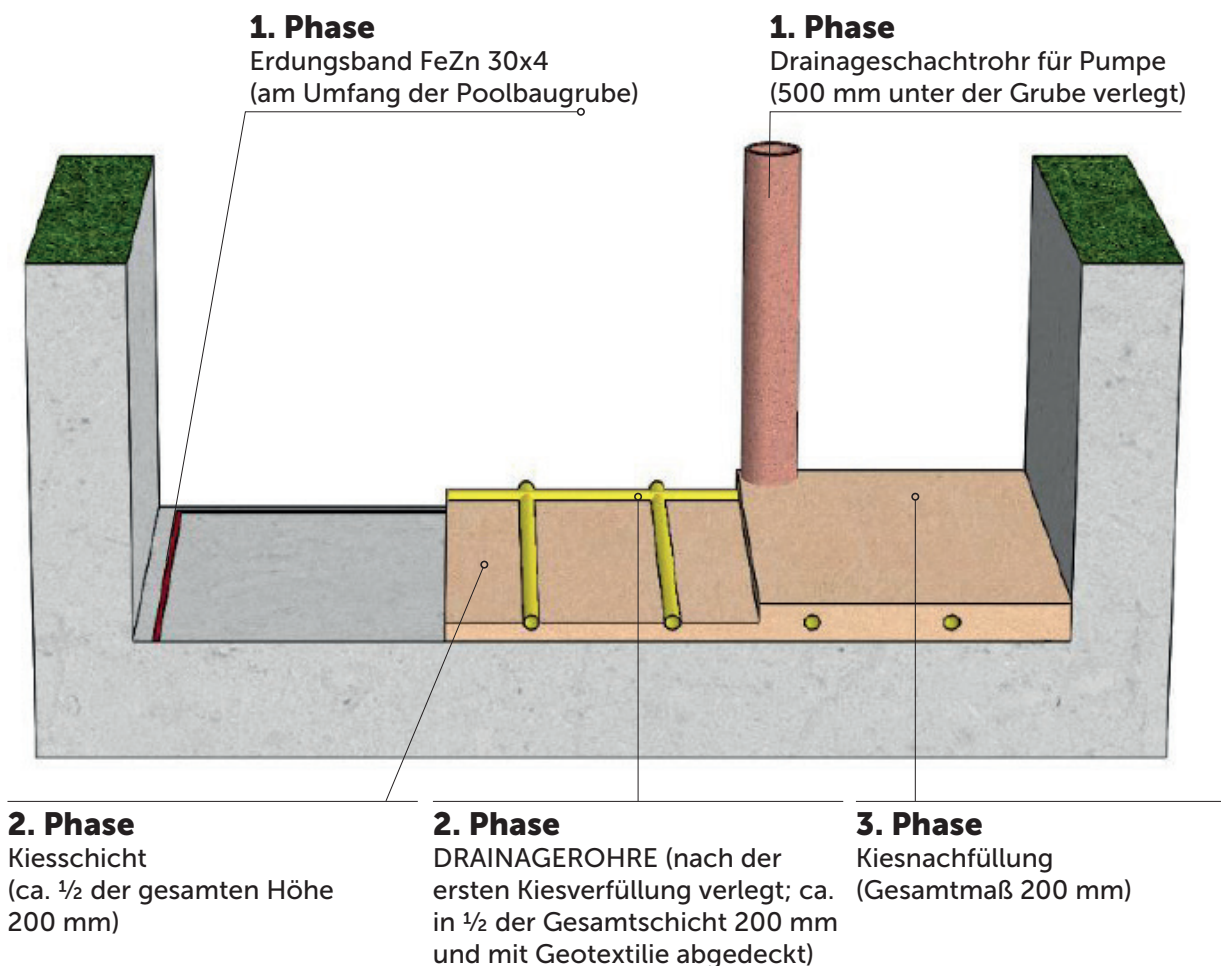

#### Wichtiger Hinweis:

Die Entwässerung der Bodenplatten ist ein sehr wichtiger Bestandteil der baulichen Vorbereitung. Das Niederschlagswasser bzw. Grundwasser kann zu einer sehr starken Verformung des Poolskeletts führen, daher muss die Bodenplatte ordnungsgemäß entwässert werden. Wenn der Standort für das Aufsetzen des Pools abfallendes Terrain, ggf. tonhaltigen Unterboden aufweist, der beim Beginn der Aushubarbeiten festgestellt wird (erhöhte Wahrscheinlichkeit des Grundwassers und dessen Druck auf den Poolkörper), empfehlen wir Ihnen, eine geologische Untersuchung für Fundamentarbeiten durchzuführen. Aufgrund des Ergebnisses empfehlen wir Ihnen, erweiterte Bau- und Entwässerungsmaßnahmen in Bezug auf den jeweiligen Standort zu ergreifen, die außerhalb des Poolentwässerungssystems gelöst werden.

Schäden am Pool, die auf unzureichende oder mangelhafte bauliche Vorbereitung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Gewährleistung aufgrund mangelhafter Leistung. Daher ist es wichtig, die Baufirma und ihre Abläufe kontinuierlich zu überwachen. Wir empfehlen eine regelmäßige Fotodokumentation aller Bauschritte.

# 4.

## Betonieren der Bodenplatte

### 1. Vorbereitung der Schalung zum Betonieren.

Bauen Sie die Schalung gemäß den Grundrissabmessungen auf S. 4 auf der verdichteten Schicht. Die Schalungshöhe 200 mm muss abhängig von anderen Höhenmaßen auf Seite 5 angepasst werden. Die Schalung muss horizontal sein. Vorgeschriebene Ebenheit der Schalung +/- 2 mm über den gesamten Umfang. Letzte Inspektion der Grube. Die Bodenplatte darf nicht in die gesamte Baugrube eingebaut werden. Lassen Sie zwischen der Bodenplatte und der Baugrubenwand ein zugelassenes Kiesbett.


### 2. Erste Betonschicht.\*

Verteilen Sie die erste Betonschicht, auf die die Bewehrung gelegt wird, bis zu 1/3 der Schalungshöhe in der vorbereiteten Schalung.

Zum Betonieren der Bodenplatte Beton der Qualitätsklasse C16/20 verwenden

### 3. Installation von Bewehrungsmatten und Vorbereitung für die Armierungsnut. 3. Phase

Verstärken Sie die Bodenplatte mit einer Bewehrungsmatte von Maschenweite 100x100 mm, Draht 6 mm. Es ist nicht notwendig, die Bodenplatte unter dem Technologieschacht zu verstärken. Zur perfekten Stabilisierung des Pools während des Betonierens empfiehlt sich die so genannte Armierungsnut. Die Armierungsnut dient zur Verbindung der Bodenplatte und der Thermokonstruktion mit dem Poolskelett. Wenn Sie eine Armierungsnut in die Bodenplatte einbringen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

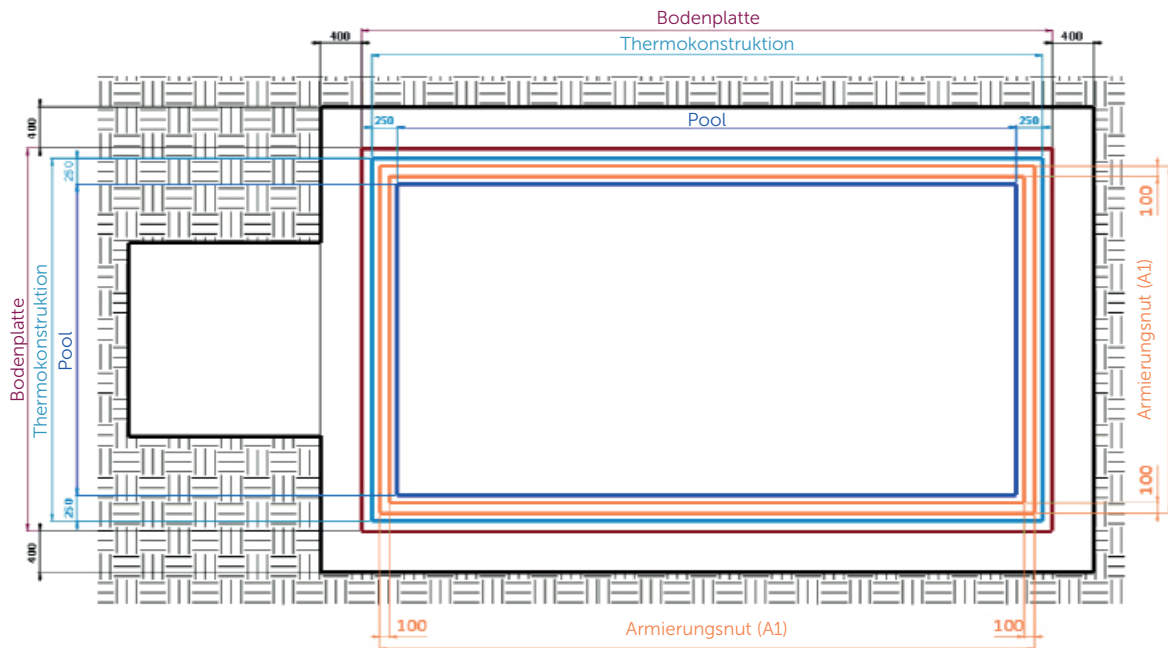

Abmessungen der Armierungsnuten	A	A1
Pool QBIG BENEFIT – 3 x 5 m	3.350 mm	5.350 mm
Pool QBIG BENEFIT – 3 x 6 m	3.350 mm	6.350 mm
Pool QBIG BENEFIT – 3,5 x 7 m	3.850 mm	7.350 mm
Pool QBIG BENEFIT – 4 x 8 m	4.350 mm	8.350 mm
Pool QBIG BENEFIT – 3 x 7 m	3.350 mm	7.350 mm
Pool QBIG BENEFIT – 3 x 8 m	3.350 mm	8.350 mm


\*Beide Betonschichten sollten gleichzeitig gegossen werden.

## 4. Zweite Betonschicht (Vorbereitung für die Endschicht) 4. Phase\*

Nun eine zweite Betonschicht bis zur Schalungshöhe auf die verlegten Bewehrungsmatten auftragen. Das Betonieren der 2. Betonschicht erfolgt unmittelbar nach dem Betonieren der 1. Schicht.

Fertigen Sie Armierungsnuten in dieser Schicht an (Armierungsnuten werden empfohlen; wenn Sie diese nicht in der Bodenplatte vorbereitet haben, überspringen Sie diesen Schritt), in die Sie in den nächsten Schritten die Bewehrung vertikal durch die Thermokonstruktion installieren. Die Innenkante der Armierungsnut sollte einen Abstand von 75 mm von der Innenkante des Poolskeletts auf dem gesamten Umfang des Pools haben. (Siehe Abbildung und Tabelle auf der vorherigen Seite).

Die erforderliche Ebenheit der Bodenplatte beträgt  $\pm 10$  mm über die gesamte Oberfläche.

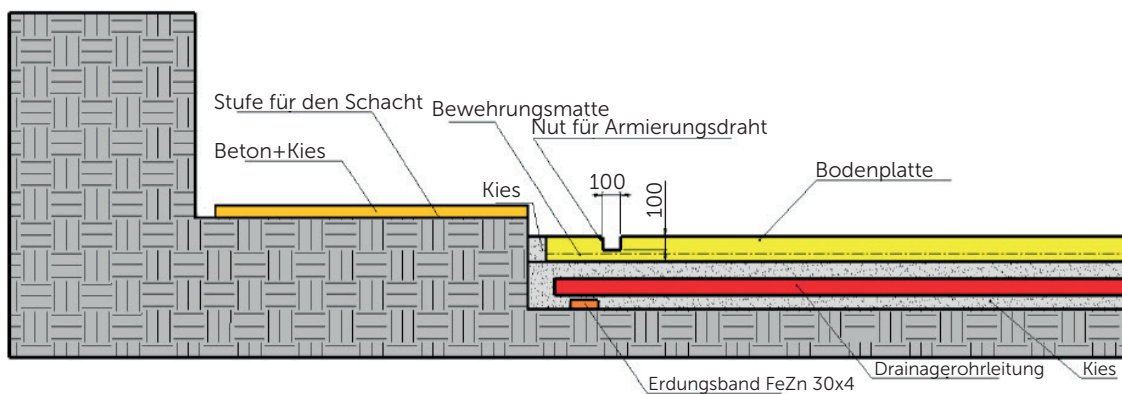


## 5. Endbetonschicht.

Nach mindestens 48 Stunden eine Ebenheitsprüfung durchführen. Diese Schicht nur dann mit einer selbstnivellierenden Zementspachtelmasse auftragen, wenn die erforderliche Ebenheit in der zweiten Schicht nicht erreicht wurde.

Die Endvermessung im beigegeführten Protokoll vermerken (KUNDENERKLÄRUNG ZUR VERMESSUNG DER POOLBODENPLATTE).

### 4. Phase

Zweite Betonschicht (bis zur Gesamthöhe der Platte – 200 mm)

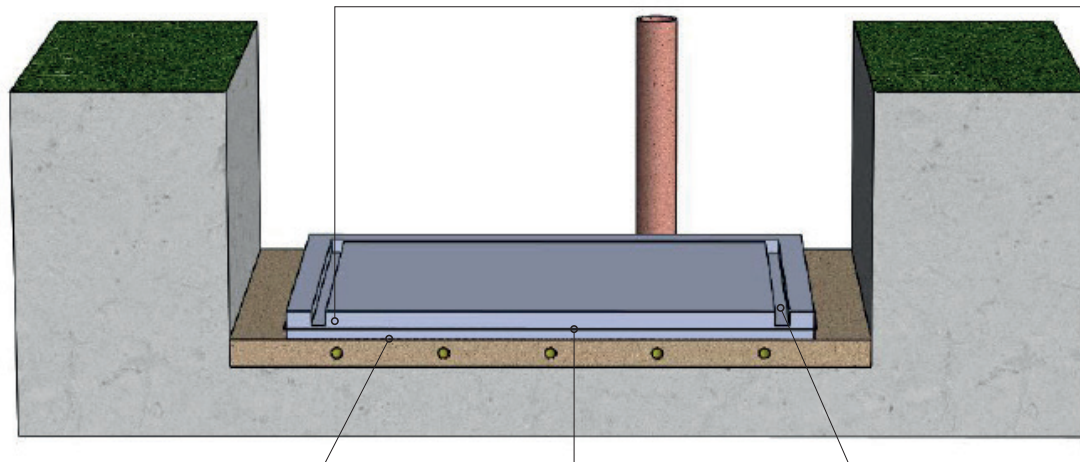

### 2. Phase

Erste Betonschicht  
(ca. in 1/3 Höhe der Betonplatte)

### 3. Phase

Bewehrungsmatte  
(ca. in 1/3 Höhe der Betonplatte)

### 3. Phase


Armierungsnut 100 x 100 mm  
(für Armierungsdraht)

\*Beide Betonschichten sollten gleichzeitig gegossen werden.

# 5.

## Meldung der baulichen Vorbereitung

Muster eines korrekt ausgefüllten Formulars\* - grüner Text

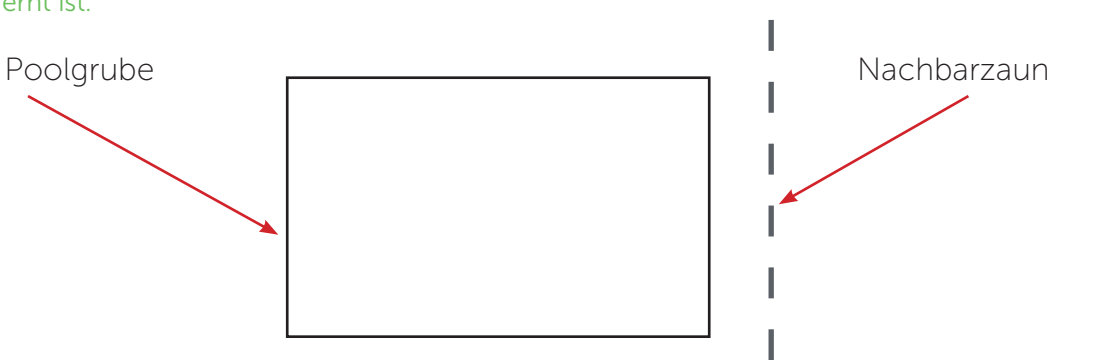Meldung der baulichen Vorbereitung					
Bestellungsnummer	123456789	Vor- und Nachname des Kunden		Josef Novák	
Adresse	Novákova 123, Předměstí 123 45				
Poolabmessungen gemäß Bestellung	Breite	Länge	Tiefe	Einheiten	
	400	750	150	cm	
<p>Leeres Feld für eventuelle Zeichnung eines möglichen Hindernisses:            Auf dem Foto „Umgebung der Grube“ sehen Sie den Nachbarzaun, der 120 cm von der Grube entfernt ist.</p> 					
Entfernung der Grube von der Stelle, die das Fahrzeug mit dem Pool erreicht		Abmessung der engsten Durchfahrtstelle (Tor, Bäume, ...)		Den Krantyp entsprechend dem Gewicht des Pools und der Entfernung des Aufstellungsorts wählen. Je weiter der Aufstellungsort entfernt ist, desto niedriger ist die Tragfähigkeit der Krane.	
150	Einheiten cm	450	Einheiten cm		
Fotodokumentation der baulichen Vorbereitung: der E-Mail beigefügt					
Bodenaushub	JA	Bodenplatte	JA	Drainageset	JA
Entwässerungsschacht	JA	Rückhaltetank	JA	Drainage	JA
Aufstellungsort des Technischachts	JA	Umgebung der Grube	JA	Sonstiges	JA
Fotodokumentation der Zuwegung von der Straße zur Grube: der E-Mail beigefügt					
Zuwegung	JA	Einfahrt zum Grundstück	JA	Stellplatz für das Fahrzeug mit dem Pool zum Aufstellen	JA
Bitte senden Sie dieses Formular zusammen mit der vollständigen Fotodokumentation an: <a href="mailto:montaze.bazeny@albixon.cz">montaze.bazeny@albixon.cz</a>					
Der Kunde ist verpflichtet, eine vollständige Fotodokumentation, die sich aus der „Meldung der baulichen Vorbereitung“ (nach § 5 BGB) ergibt, vorzulegen. Bei Nichtlieferung der Dokumentation trägt der Kunde das Risiko, dass der Lieferant den Einbau und den Anschluss des Pools verweigert. Im Falle einer vorsätzlichen Nichteinhaltung der baulichen Vorbereitung kann eine „Anordnung des Auftraggebers“ ausgestellt werden, um diese Situation zu regeln.					

\*Das leere Formular finden Sie auf Seite 23.

# Aufsetzen des Poolskeletts und Montage der Pooltechnologie


6.

## 1. Wärmedämmung verlegen. 1. Phase

Wärmedämmung (extrudiertes Polystyrol 30 mm dick, min. Druckfestigkeit 200 kPa) auf die Bodenplatte unter dem Boden des Pools legen und gegen Verschieben sichern, zum Beispiel durch die Verwendung von Styropor mit Nut.

## 2. Einsetzen des Poolskeletts in die Grube (in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten) 2. Phase

Aufsetzen des Poolskeletts gemäß den örtlichen Gegebenheiten. Nach dem Aufsetzen überprüft der Kunde die korrekte Position und stimmt diese Tatsache mit den Mitarbeitern ab, die den Pool installieren. Nach

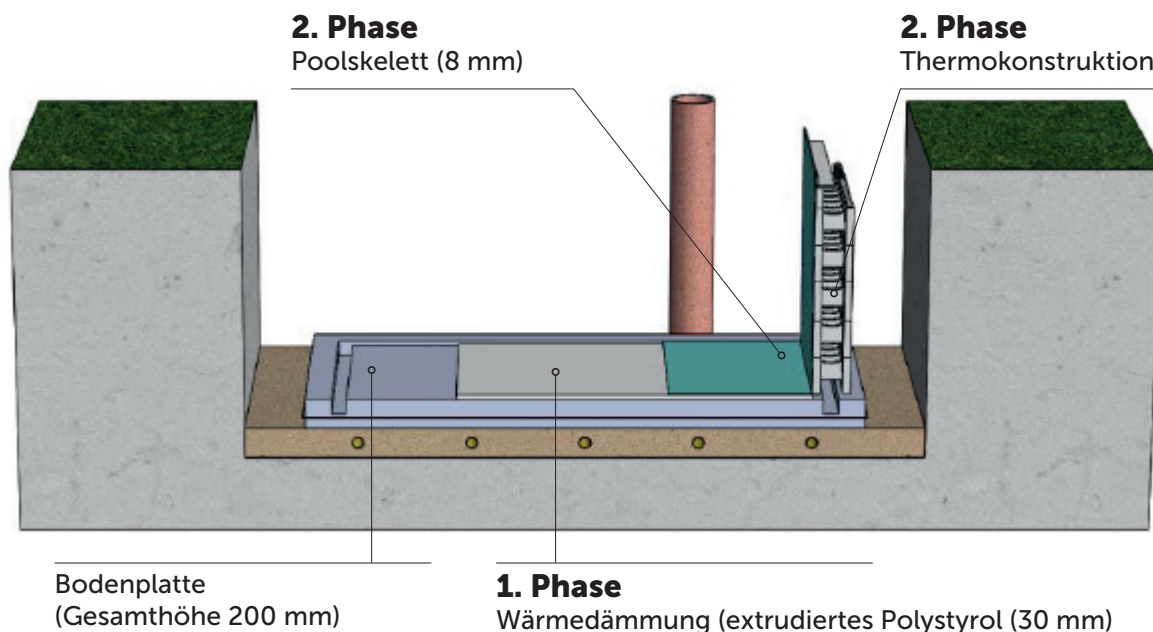

dem Einlegen in die Grube und nach Abstimmung der Position beginnen Sie den Pool mit Wasser zwecks Belastung zu füllen (ca. 300 mm).

## 3. Einbringen von Technikschrächten in die Grube.

Einbringen von Technikschrächten in die vorbereitete Grube.

## 4. Komplette Installation der Pooltechnologie.

Installation der Technologie und deren Verbindung mit dem Poolskelett mittels Rohrleitungen. Für die korrekte Verbindung von Pool und Technikschracht ist eine entsprechend vorbereitete Stufe für den Schacht gemäß Kapitel 2 Tiefe der Grube erforderlich.

## 5. Dichtheitsprüfung durch Flutung der Technologie.

Die Dichtheit von Verbindungen und Rohrleitungen wird durch die sogenannte „Flutungstechnologie“ geprüft. Für die Prüfung der Technologie durch Fluten ist die notwendige Wassermenge von bis ca. 300 mm Wasseroberfläche vorzusehen.



### Hinweis:

- anschließend sind die Arbeiten mindestens gemäß den Punkten 7 und 8 der baulichen Vorbereitung durchzuführen, um eine Beschädigung des Pools (Platzregen, Erdrutsch der Baugrube usw.) zu vermeiden.

# 7.


## Verstrebung des Pools und anschließendes Umschütten

### 1. Verstrebung des Poolskeletts

Vor dem Betonieren muss das Poolskelett in geeigneter Weise verstrebt werden. Die Verstrebung wird durchgeführt, um eventuelle Verformungen des Poolskeletts zu vermeiden. Verformungen können durch unvorsichtigen Umgang mit dem Beton und beim Umschütten mit Erde entstehen. Die Poolwände dürfen sich weder „nach innen“ noch „nach außen“ verformen, die Poolwand muss gerade sein. Es ist immer notwendig, die innere Verstrebung des Poolskeletts zu verwenden. Beim Einbau der Streben ist durch Ummantelung dieser Verstrebungselemente z. B. mit Geotextilie sicherzustellen, dass die Innenwände des Pools nicht beschädigt werden. Für eine korrekte Verstrebung des Poolskeletts ist es erforderlich, das Bördelrohr an der Innenkante des Pools vorübergehend zu entfernen. Die horizontale Verstrebung muss in einem Abstand von der Poolecke 200–250 mm in jeder Ecke in beiden Richtungen weggelassen werden - siehe rote Markierung unten.

#### Hinweis

Wird der Pool außerhalb der Badesaison installiert, müssen die Streben entfernt und der Pool nach dem Betonieren und Umfüllen mit Erde mit Wasser gefüllt werden. Sie verhindern dadurch die Verformungen durch Regenwasser und ähnliche Einflüsse. Wenn die Streben aus Holz den ganzen Winter über im Pool verbleiben, kann es zu lokalen Verfärbungen/Beschädigungen des Polypropylens durch Harz oder Ausdehnung aufgrund von Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen kommen.

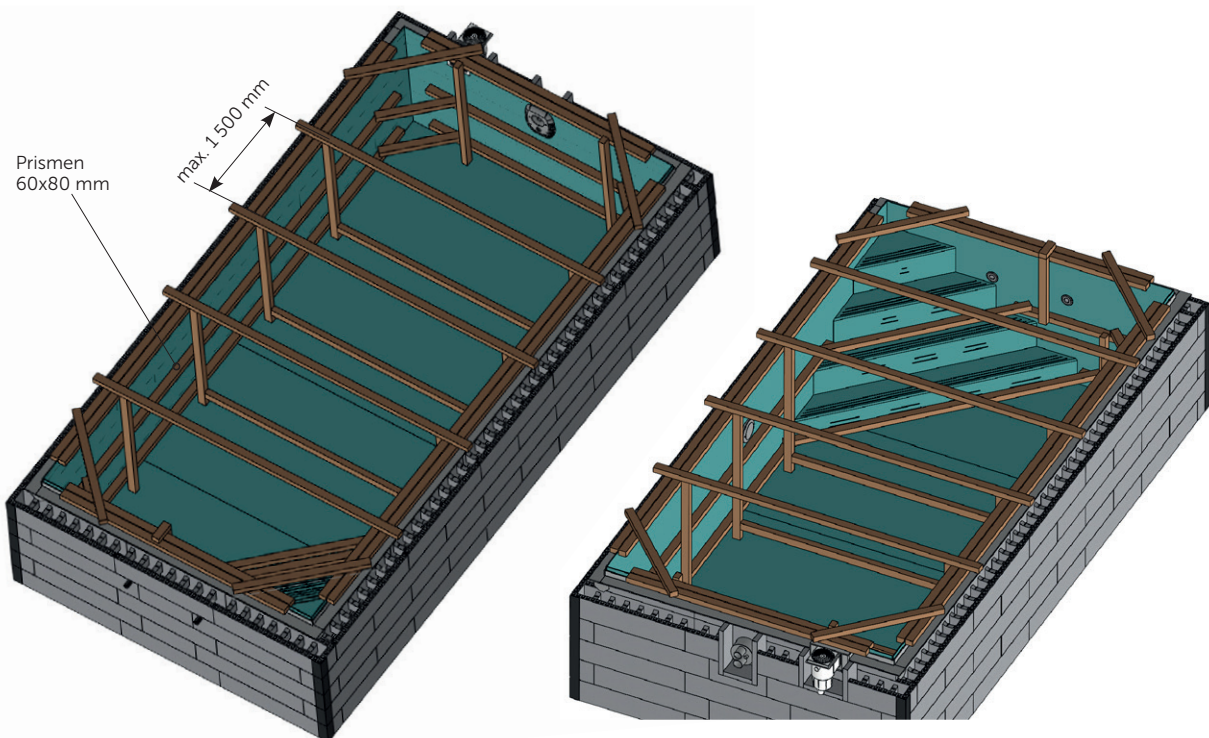


### 2. Verankerung der Wände des Skimmerpools und Verstärkung der Thermokonstruktion

Die Wände des Pools werden mit 800 mm langen Bewehrungsstahlstäben ( $\varnothing$  8 mm) verankert, die wir durch den Poolrand führen. Diese Stahlstäbe sollten idealerweise jeweils nach 400 mm um 90° gebogen sein und einen „Haken“ bilden (siehe Abbildung). Um sie durch den Rand führen zu können, müssen Sie Löcher ( $\varnothing$  10 mm) in den Rand bohren. Der Abstand der einzelnen Löcher voneinander beträgt maximal 500 mm. In die Thermokonstruktion sind vertikale Bewehrungsstahlstäbe mit einer Länge von 1.400 mm (bei Pooltiefe von 1.500 mm) und mit einer Länge 1.100 mm (bei Pooltiefe von 1.200 mm)  $\varnothing$  8 mm einzuführen. Der maximale Abstand der vertikalen Armierung beträgt je 500 mm. Die angegebenen Werte sind Mindestlängen, wobei längere Stäbe verwendet werden können, aber die Thermokonstruktion und die Außenhülle des Pools dürfen nicht beschädigt werden. Die Bewehrung der Thermokonstruktion verstärkt die gesamte Konstruktion des Pools und ist für die ordnungsgemäße Festigkeit des Werks erforderlich.

# Verstrebung des Pools und anschließendes Umschütten

7.

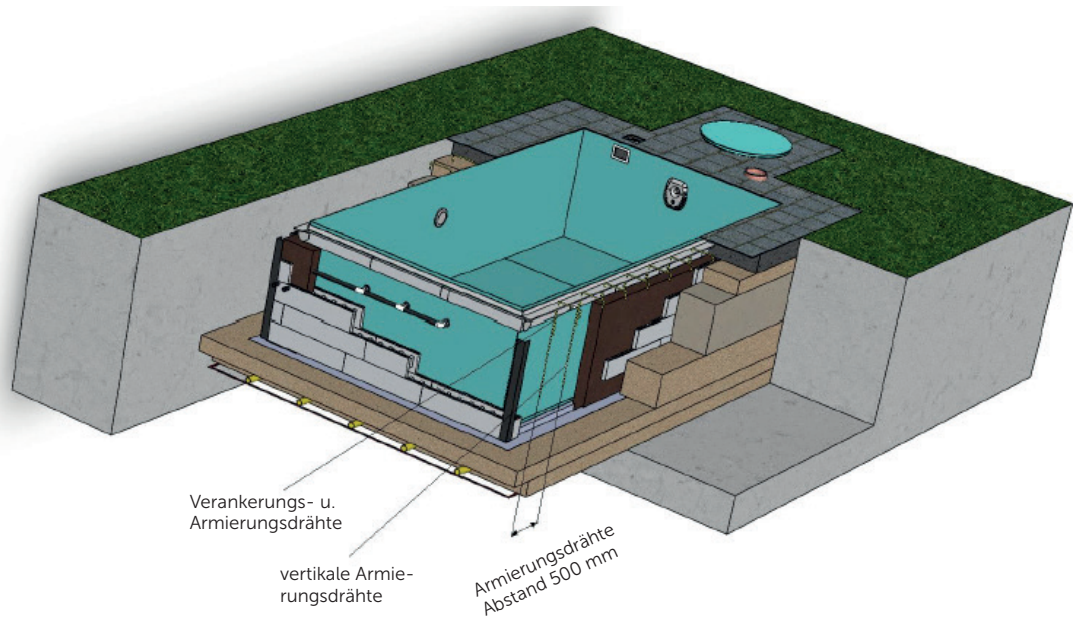


## 3. Sicherung der Thermokonstruktion gegen äußere Einflüsse

Verwenden Sie von der Außenseite der Thermokonstruktion eine geeignete Folie, um das Durchwachsen der Wurzeln zu verhindern.

## 4. Umschütten mit Kies und recycelter Beton

Nach dem Platzieren der Bewehrungsstäbe können Sie den Umfang des Pools bis zu etwa einem Drittel mit Kies (Körnung 8/16 mm) umschütten (Vorsicht, nicht verdichten!). Füllen Sie den Rest der Höhe mit Betonrecyclat der Körnung 0/32 oder Material mit ähnlichen Eigenschaften auf, das keine größeren Gesteinsbrocken oder scharfen Gegenstände enthält und nicht verdichtet werden muss. Vergewissern Sie sich vor dem Umschütten, dass sich im Verfüllbereich kein Anschlusskasten für Lichter, Rohrleitungsventil oder andere Komponenten befinden, die zugänglich sein müssen. Durch das Umschütten muss sichergestellt werden, dass die Thermokonstruktion auf das Poolskelett ausreichend gedrückt wird.

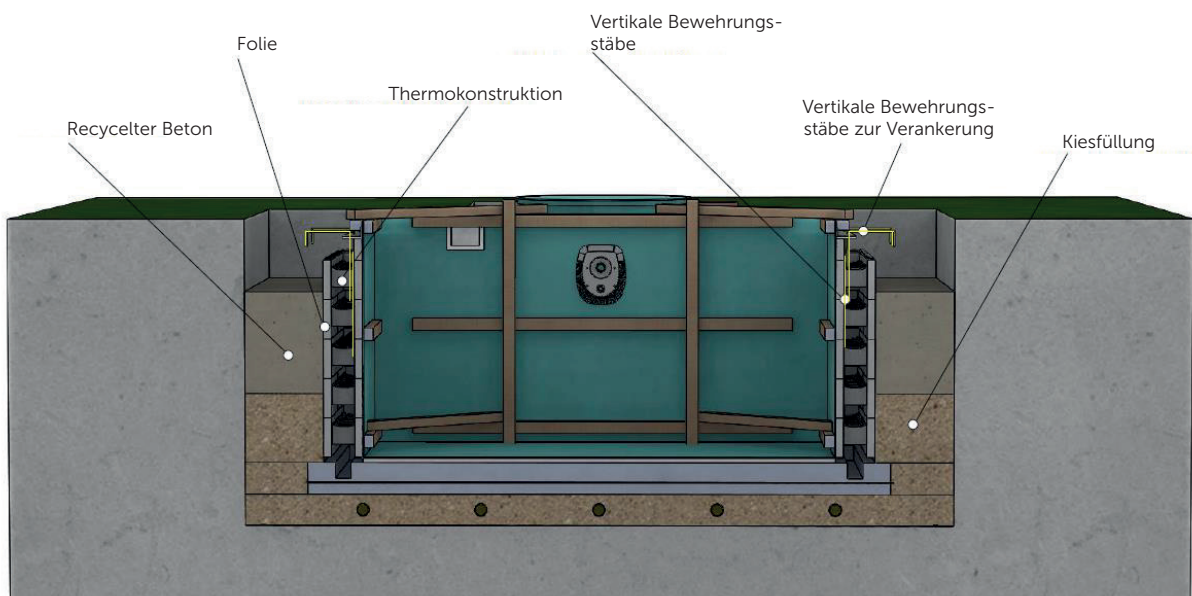

## 1. Geeignete Umgebungstemperatur ermitteln

Das Poolskelett darf nicht bei Temperaturen von 10 °C oder weniger betoniert werden. Gleichzeitig darf es nicht bei Temperaturen von 25 °C oder höher betoniert werden. Das Polypropylen weist einen hohen Grad an Beständigkeit gegen: Durchstoßen, Brechen, Schneiden, Scheren auf, ist bei normalen Temperaturen nicht spröde, ist ausreichend hart und fest. Aufgrund der allgemeinen physikalischen Eigenschaften von Kunststoffen und wie bei anderen Polypropylenen ist auch dieses Material thermisch dehnbar. Es ist ein natürliches physikalisches Phänomen. Die Einwirkung von Sonneneinstrahlung, warme Luft beim Entleeren des Pools oder zu warmes Wasser können dazu führen, dass es zum Ausbeulen (zur Wellung) der Wände und Seiten des Pools kommt. Beim Betonieren wirkt auf das Poolmaterial, außerhalb des vom Hersteller empfohlenen optimalen Bereichs von 10 bis 25 °C, ein Druck, der mit der Ausdehnung des Materials verbunden ist. Beim Betonieren außerhalb des genannten Bereichs können sich am Poolskelett Formänderungen ergeben. Für diese Änderungen kann kein Anspruch aufgrund mangelhafter Leistung geltend gemacht werden.

## 2. Beginn des Betonierens


Die so vorbereitete Thermokonstruktion kann vorsichtig Schicht für Schicht mit der Betonmischung ausgegossen werden. Nicht an einer Stelle, sondern um den gesamten Umfang der Thermokonstruktion herum. Überprüfen Sie stets die Vertikalität und Horizontalität des Polystyrol-Poolskeletts und die Unversehrtheit der Polystyrol-Schalung nach dem Ausgießen von jeweils etwa 200 mm. Verwenden Sie beim Betonieren keine Vibrationsverdichtung der Betonmischung in der Thermokonstruktion.

Verwenden Sie zum Betonieren der Thermokonstruktion bewehrten Beton C 20/25 halbflüssig, Konsistenz S3, mit der Körnung 0/8, und wir empfehlen die Verwendung eines Fließmittels, um die Fließfähigkeit beim Gießen der Wand zu erhöhen. Die Befüllung erfolgt manuell oder mit Hilfe einer stufenlos regelbaren Autopumpe, vorzugsweise mit einem Schlauch mit 65 mm Durchmesser. Die Bewehrung darf keine Schäden an der Thermokonstruktion verursachen.

Wenn es notwendig ist, auf die klassische Bewehrung zu verzichten, kann Stahlfaserbeton STEELCRETE D oder Faserbeton mit der Bezeichnung C20/25 XC1 mit einem Fasergehalt von 0,6 kg/m<sup>3</sup> verwendet werden.

Der ungefähre Verbrauch von Beton C 20/25 (mit Zuschlag der Körnung 0/8) beträgt 0,14 m<sup>3</sup> pro 1 m<sup>2</sup> der Thermokonstruktion:

Skimmer 3 m x 4 m – Tiefe 120	– 2,12 m <sup>3</sup>	Skimmer 3,5 m x 7 m – Tiefe 120	– 3,10 m <sup>3</sup>
Skimmer 3 m x 4 m – Tiefe 150	– 2,60 m <sup>3</sup>	Skimmer 3,5 m x 7 m – Tiefe 150	– 3,70 m <sup>3</sup>
Skimmer 3 m x 6 m – Tiefe 120	– 2,68 m <sup>3</sup>	Skimmer 4 m x 8 m – Tiefe 120	– 3,46 m <sup>3</sup>
Skimmer 3 m x 6 m – Tiefe 150	– 3,29 m <sup>3</sup>	Skimmer 4 m x 8 m – Tiefe 150	– 4,27 m <sup>3</sup>

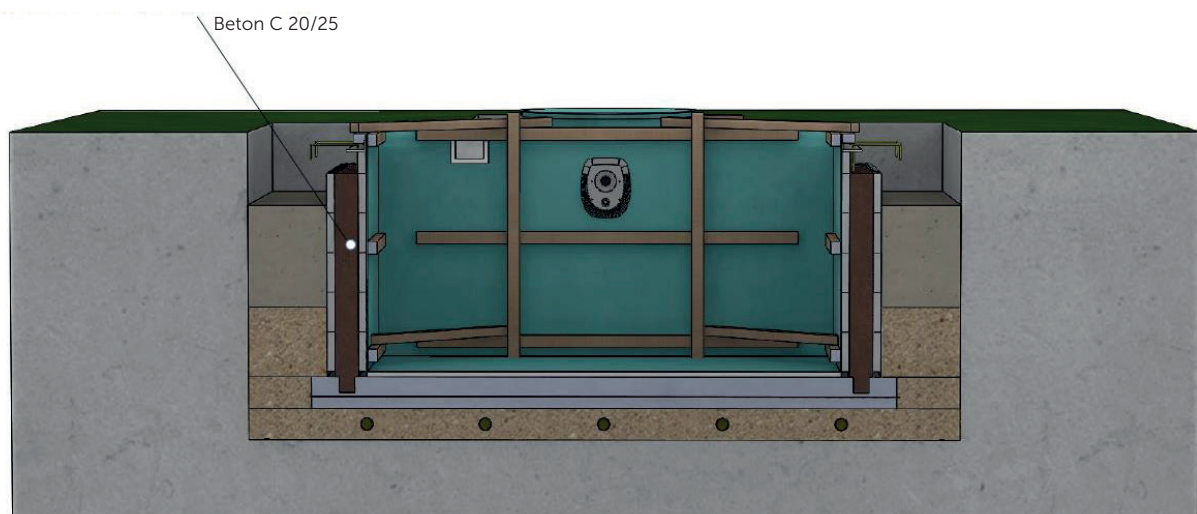


### Hinweis

Falls der Pool wegen der Installation des Holzverschlags entleert werden muss, ist es notwendig, 30 cm Wasser in den Pool nachzufüllen, was während des gesamten Betoniervorgangs beibehalten werden muss.



## 3. Nachfüllen der Thermokonstruktion

Nachdem der verwendete Beton in der Thermokonstruktion ausgehärtet ist, Kies 8/16 bis gesamten Höhe der Thermokonstruktion nachfüllen. Überprüfen Sie auch die Ebenheit der Wände und der Diagonale des Pools.

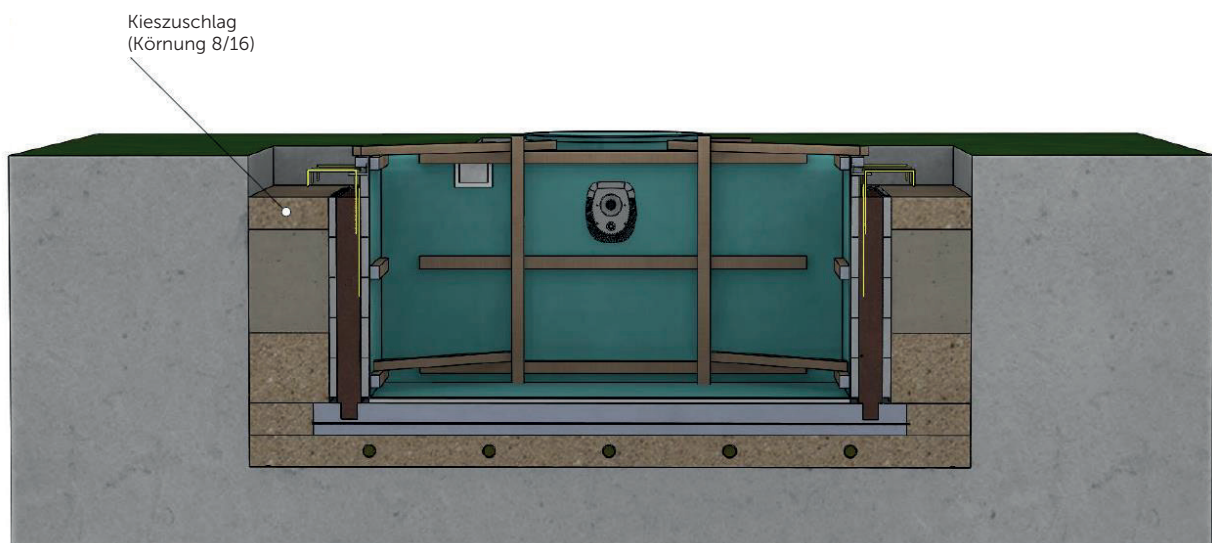

## 4. Betonieren des Technischachts (wenn im Werkvertrag enthalten)

Ist ein Technischacht im Lieferumfang enthalten, muss dieser ummauert oder mit Beton ummantelt werden. Der untere Teil des Technischachts muss mit Beton verankert und danach mit ca. 150 mm dickem Beton bis zum oberen Kunststoffkragen ummantelt werden, der in der Untergrundplatte für die Endoberfläche einbetoniert werden muss. Der Technischacht kann gegen Beschädigung mit Geotextilie geschützt werden. Abhängig von den örtlichen Gegebenheiten (Wechsel von Schatten und Sonne usw.) ist es erforderlich, die Innenfläche des Schachtdeckels mit Polystyrol mit einer Dicke von min. 30 mm zu isolieren. Diese Isolierung verhindert Feuchtigkeitskondensation an der Innenseite des Deckels. Das Innere des Schachts sollte trocken und belüftet sein. Dazu den Schachtdeckel so abstützen, dass zwischen der Kante der Schachtwand und unter dem Deckel Luft strömen kann. Diese Maßnahmen liegen in der Verantwortung des Benutzers in Bezug auf die örtlichen Bedingungen, unter denen sich der Schacht befindet (Wechsel von Schatten und Sonne, Luftfeuchtigkeit usw.).

Rohre, die im Boden vom Pool zum Technischacht oder zum Technikraum verlegt sind, müssen in einem Sandbett mit einer Abdeckschicht von mind. 100 mm über und unter der Rohrleitung liegen, wodurch etwaige Drücke auf die Rohrleitung ausgeglichen werden. Versehen Sie das Rohr mit einer geeigneten Isolierung, zum Beispiel einer Mirelon-Manschette mit einer Dicke von 10 mm, die eine mechanische Beschädigung des Rohrs verhindert. Das Sandbett muss von der Rohrleitungsdurchführung in den Technischacht bis zur Mündung der Rohrleitung aus der Thermokonstruktion reichen. Das Sandbett muss frei von Steinen und Lehm sein. Fahrzeuge dürfen die Rohrverlegestellen nicht passieren oder diese müssen vom Kunden ausreichend geschützt werden.

# 9.

## Herstellung der Untergrundplatte für die Endoberfläche

### 1. Maßnahmen gegen Beschädigung der Außenhülle des Pools.

Das Poolskelett ist anschließend in geeigneter Weise umlaufend gegen Beschädigungen zu sichern, z.B. mit einem Schaumfolie-Band abzukleben, um die Außenhülle des Pools vor Beschädigungen durch scharfe Gegenstände zu schützen und gleichzeitig die Dehnung zu ermöglichen. Messen Sie die Höhe, in der Sie den Deckel des Skimmers benötigen. Die Höhe kann manuell eingestellt werden, indem der Deckel bis um 30 mm ausgeschoben wird.

### 2. Unterbauschicht aus Kies für Endoberfläche

Unter die Betonplatte, auf der die Endoberfläche um den Pool aufgebracht wird, das Schottergestein (Körnung 16/32 bis frostfreie Tiefe) legen. Der obere sichtbare Teil muss mit der Endoberfläche mittels handelsüblicher dauerelastischer Kite verbunden werden (der optimal gefüllte Raum zwischen der Endoberfläche und der Außenwand des Pools ist mind. 5 mm).




### 3. Herstellung der Untergrundplatte für die Endoberfläche

Die Höhe der Untergrundplatte ist abhängig von der Höhe der Endoberfläche (Pflaster, Steinteppich, ...) und deren Gefälle. Diese Platte muss monolithisch sein und mit Bewehrungsmatte (Maschenweite 100x100 mm, Draht 6 mm) verstärkt werden. Die Höhe der Untergrundplatte ist abhängig von der Höhe der gewählten Pflastersteine. Die endgültige Untergrundplatte unter den Pflastersteinen herstellen, eventuelle Unebenheiten können mit Spachtel ausgeglichen werden. Wenn Sie eine Überdachung installieren möchten, ist eine feste Verbindung der Pflastersteine mit der Untergrundplatte entweder durch Unterbetonierung von Pflastersteinen oder mit einer anderen geeigneten Methode erforderlich. In dieser Phase müssen auch die Verankerungselemente (Kunststofffüße) für Pooltreppe und Anschlusskästen für Poolbeleuchtung installiert werden, wenn diese Elemente im Werkvertrag enthalten sind. Die Endoberfläche für eventuelle Überdachung muss fest mit dem Betonuntergrund verbunden sein. Die Pflastersteine sind die beste Variante der endgültigen Oberfläche, sie müssen mit dem Betonuntergrund fest verbunden sein (darf nicht mit Sand oder Kies hinterfüllt sein) Für die Endsicht eignen sich ferner alle zu diesem Zweck bestimmten festen Werkstoffe, sofern sie mit dem Betonuntergrund fest verbunden werden.






# MÖGLICHKEITEN DES BAULICHEN ABSCHLUSSES VON ALBISTONE-POOL:

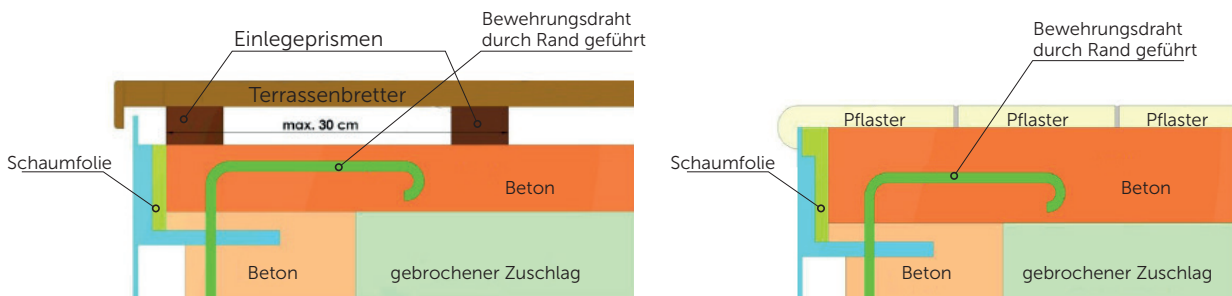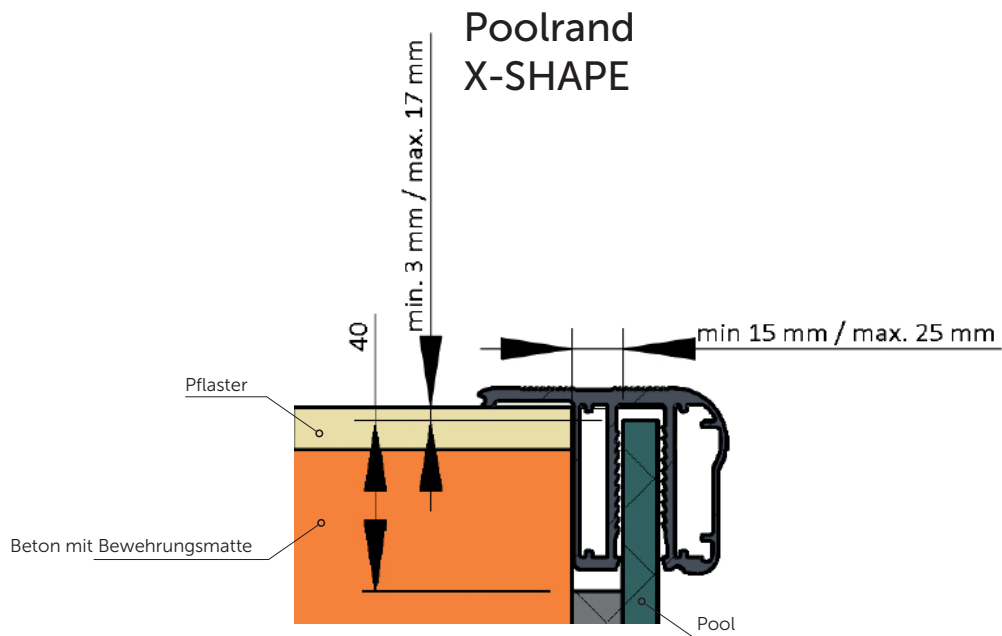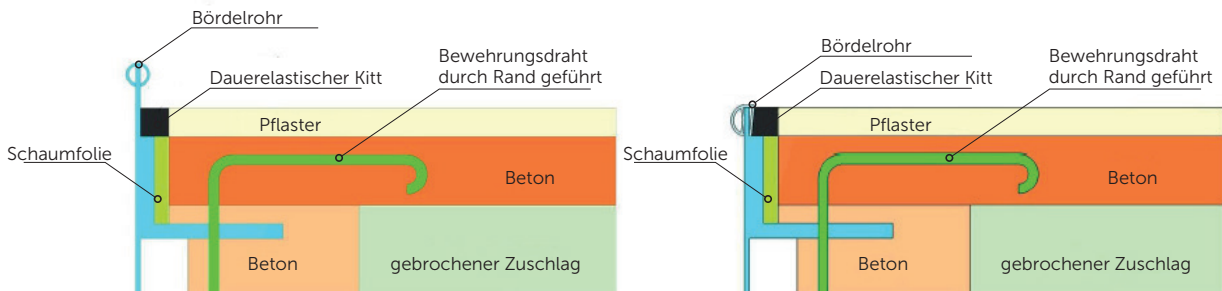

# ERKLÄRUNG DES KUNDEN ÜBER DIE NACHMESSUNG DER GRUNDPLATTE FÜR DAS SCHWIMMBECKEN

Personalausweisnummer	1234567890	Vor- und Zuname des Kunden	Jan Novak		
Adresse	Zbraslavská 55, Praha 5, 158 00				
Abmessungen des Schwimmbeckens	Breite		Länge		Tiefe
	3 000	mm	6 000	mm	1 500 mm
Grubenmaße (Minimale Sollwerte)	Grubenbreite		Grubenlänge		Grubentiefe
	4 500	mm	7 500	mm	1 500 mm
Gemessene Grubenabmessungen	4580	mm	7620	mm	1530 mm

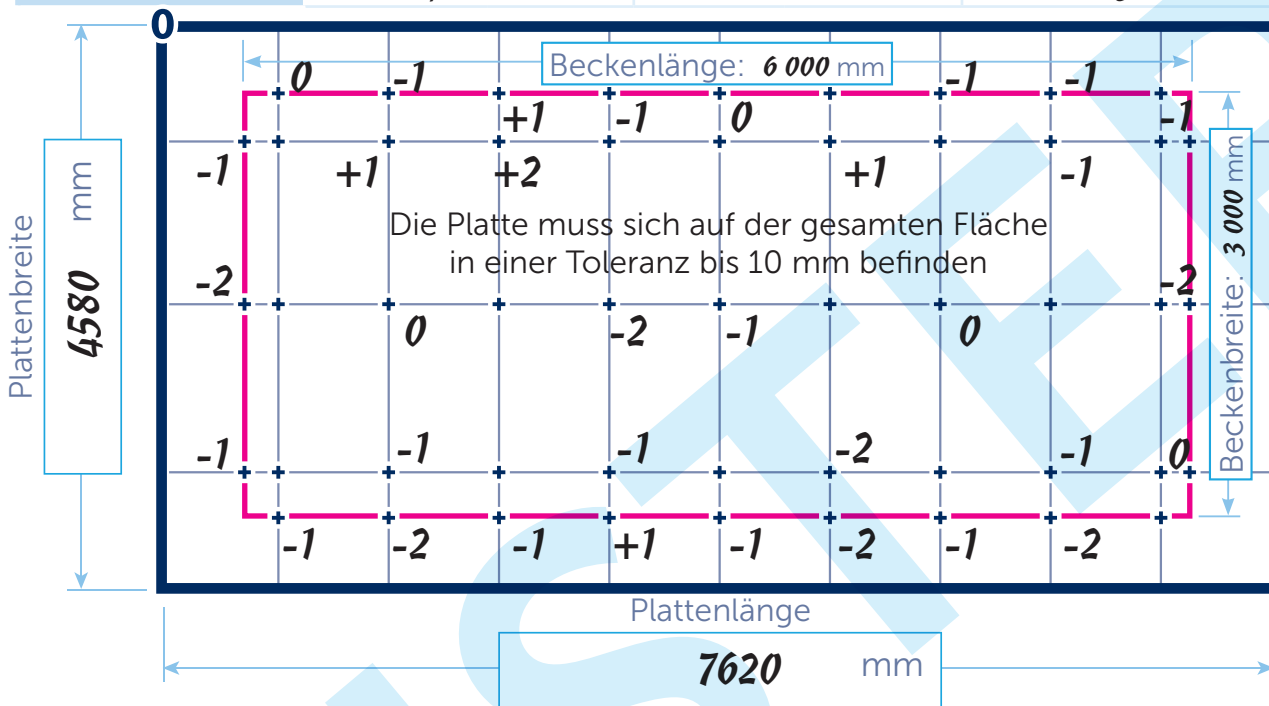

**i** 0 – Referenzmesspunkt **Gemessene Mindestmenge:** + 20 Punkte am Umfang + 12 Innenpunkte (alle gemessenen Daten müssen in mm sein)

Horizontalität der Fundamentplatte **ENTSPRICHT / ~~ENTSPRICHT NICHT~~** \* der vorgeschriebenen Toleranz +/- 10 mm auf der gesamten Fläche des Beckenskellerts. \* Streichen, falls nicht zutreffend

**Die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Horizontalität der Grundplatte führt dazu, dass Wasser nicht gleichmäßig über den gesamten Umfang des Pools verschüttet wird, und diese Tatsache kann nicht Gegenstand einer Beschwerde sein.**

Es ist wichtig, dass die Messung der vorgeschriebenen Toleranz von einer autorisierten

**Varianten der Neuvermessung und Bestätigung von Messwerten:** (kreisen Sie die gewählte Variante ein)

- 1, Der Kunde misst die Platte selbst und übernimmt die volle Verantwortung für die im Bericht angegebenen Werte und Parameter
- 2, Die Messung wird von einer autorisierten Person im Bauwesen durchgeführt - für die im Bericht angegebenen Parameter ist die autorisierte Person verantwortlich
- 3,** Die Messung wird von einem ALBIXON-Techniker durchgeführt - dieser Service kostet 5 000 CZK
- 4, Bei Nichteinhaltung der Ebenheit erfolgt die Umsetzung nur im Auftrag des Kunden

**Die Abgabe dieser ordnungsgemäß ausgefüllten und bestätigten Erklärung durch den Kunden ist Vertragsbedingung für die Übergabe des Arbeitsplatzes und den Beginn der Arbeit durch ALBIXON a.s.**

ALBIXON a.s. weist darauf hin, dass im Falle einer Verzögerung der Mitteilung der Baubereitschaft der im Vertrag festgelegte Liefertermin um diesen Zeitraum verlängert wird.

Verwenden Sie ein optisches Gerät oder ein Lasergerät mit einer Mindestmessgenauigkeit von +/- 1 mm / 10 m, um die vorgeschriebene Horizontalität zu messen.


Gemessen am:  <b>20. 2. 2016</b>	Art des verwendeten des Geräts: <b>HILTI PR-2 HS</b>	Parameter und Genauigkeit des Geräts: <b>+/- 0,5 mm/10 m</b>	Datum der letzten Kalibrierung des Geräts: <b>11. 11. 2015</b>
	Messen/ Messung durchgeführt von: <b>Frantz Kozel, Stavbaz,</b>	Autorisierungsnummer: <b>CKAIT - xxxxxxx</b>	Datum, Stempel und Unterschrift: <b>20. 2. 2016</b>
	Vor- und Nachname des Kunden: <b>Jan Novak</b>	Datum und Unterschrift: <b>20. 2. 2016</b>	



Bitte senden Sie das ordnungsgemäß ausgefüllte Protokoll an: [montaze.bazeny@albixon.cz](mailto:montaze.bazeny@albixon.cz)

# ERKLÄRUNG DES KUNDEN ÜBER DIE NACHMESSUNG DER GRUNDPLATTE FÜR DAS SCHWIMMBECKEN

Personalausweisnummer	Vor- und Zuname des Kunden		
Adresse			
Abmessungen des Schwimmbeckens	Breite	Länge	Tiefe
	mm	mm	mm
Grubenmaße (Minimale Sollwerte)	Grubenbreite	Grubenlänge	Grubentiefe
	mm	mm	mm
Gemessene Grubenabmessungen	mm	mm	mm

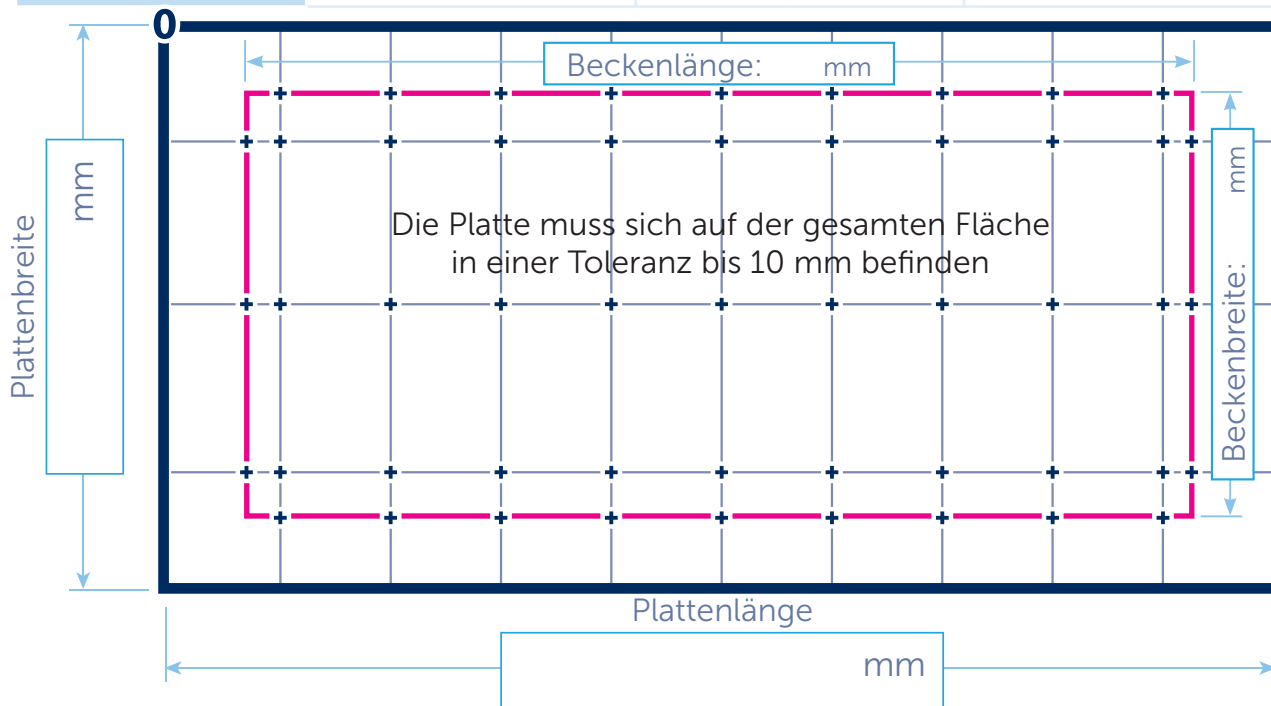

**i** 0 – Referenzmesspunkt **Gemessene Mindestmenge:** + 20 Punkte am Umfang + 12 Innenpunkte (alle gemessenen Daten müssen in mm sein)

Horizontalität der Fundamentplatte **ENTSPRICHT / ENTSPRICHT NICHT** \* der vorgeschriebenen Toleranz +/- 10 mm auf der gesamten Fläche des Beckenskeletts. \* Streichen, falls nicht zutreffend

**Die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Horizontalität der Grundplatte führt dazu, dass Wasser nicht gleichmäßig über den gesamten Umfang des Pools verschüttet wird, und diese Tatsache kann nicht Gegenstand einer Beschwerde sein.**

Es ist wichtig, dass die Messung der vorgeschriebenen Toleranz von einer autorisierten

**Varianten der Neuvermessung und Bestätigung von Messwerten:** (kreisen Sie die gewählte Variante ein)

- 1, Der Kunde misst die Platte selbst und übernimmt die volle Verantwortung für die im Bericht angegebenen Werte und Parameter
- 2, Die Messung wird von einer autorisierten Person im Bauwesen durchgeführt - für die im Bericht angegebenen Parameter ist die autorisierte Person verantwortlich
- 3, Die Messung wird von einem ALBIXON-Techniker durchgeführt - dieser Service kostet 5 000 CZK
- 4, Bei Nichteinhaltung der Ebenheit erfolgt die Umsetzung nur im Auftrag des Kunden

**Die Abgabe dieser ordnungsgemäß ausgefüllten und bestätigten Erklärung durch den Kunden ist Vertragsbedingung für die Übergabe des Arbeitsplatzes und den Beginn der Arbeit durch ALBIXON a.s.**


**ALBIXON a.s. weist darauf hin, dass im Falle einer Verzögerung der Mitteilung der Baubereitschaft der im Vertrag festgelegte Liefertermin um diesen Zeitraum verlängert wird.**

Verwenden Sie ein optisches Gerät oder ein Lasergerät mit einer Mindestmessgenauigkeit von +/- 1 mm / 10 m, um die vorgeschriebene Horizontalität zu messen.


Gemessen am:	Art des verwendeten des Geräts:	Parameter und Genauigkeit des Geräts:	Datum der letzten Kalibrierung des Geräts:
	Messen/ Messung durchgeführt von:	Autorisierungsnummer:	Datum, Stempel und Unterschrift:
	Vor- und Nachname des Kunden::		Datum und Unterschrift:



Bitte senden Sie das ordnungsgemäß ausgefüllte Protokoll an: [montaze.bazeny@albixon.cz](mailto:montaze.bazeny@albixon.cz)



Meldung der baulichen Vorbereitung					
Bestellungsnummer		Vor- und Nachname des Kunden			
Adresse					
Poolabmessungen gemäß Bestellung	Breite	Länge	Tiefe	Einheiten	
Leeres Feld für eventuelle Zeichnung eines möglichen Hindernisses:					
Entfernung der Grube von der Stelle, die das Fahrzeug mit dem Pool erreicht		Abmessung der engsten Durchfahrtstelle (Tor, Bäume, ...)		Den Krantyp entsprechend dem Gewicht des Pools und der Entfernung des Aufstellungsorts wählen. Je weiter der Aufstellungsort entfernt ist, desto niedriger ist die Tragfähigkeit der Krane.	
	Einheiten		Einheiten		
Fotodokumentation der baulichen Vorbereitung: der E-Mail beigefügt					
Bodenaushub		Bodenplatte		Drainageset	
Entwässerungsschacht		Rückhaltetank		Drainage	
Aufstellungsort des Technischachts		Umgebung der Grube		Sonstiges	
Fotodokumentation der Zuwegung von der Straße zur Grube: der E-Mail beigefügt					
Zuwegung		Einfahrt zum Grundstück		Stellplatz für das Fahrzeug mit dem Pool zum Aufstellen	
Bitte senden Sie dieses Formular zusammen mit der vollständigen Fotodokumentation an: <a href="mailto:montaze.bazeny@albixon.cz">montaze.bazeny@albixon.cz</a>					
Der Kunde ist verpflichtet, eine vollständige Fotodokumentation, die sich aus der „Meldung der baulichen Vorbereitung“ (nach § 5 BGB) ergibt, vorzulegen. Bei Nichtlieferung der Dokumentation trägt der Kunde das Risiko, dass der Lieferant den Einbau und den Anschluss des Pools verweigert. Im Falle einer vorsätzlichen Nichteinhaltung der baulichen Vorbereitung kann eine „Anordnung des Auftraggebers“ ausgestellt werden, um diese Situation zu regeln.					

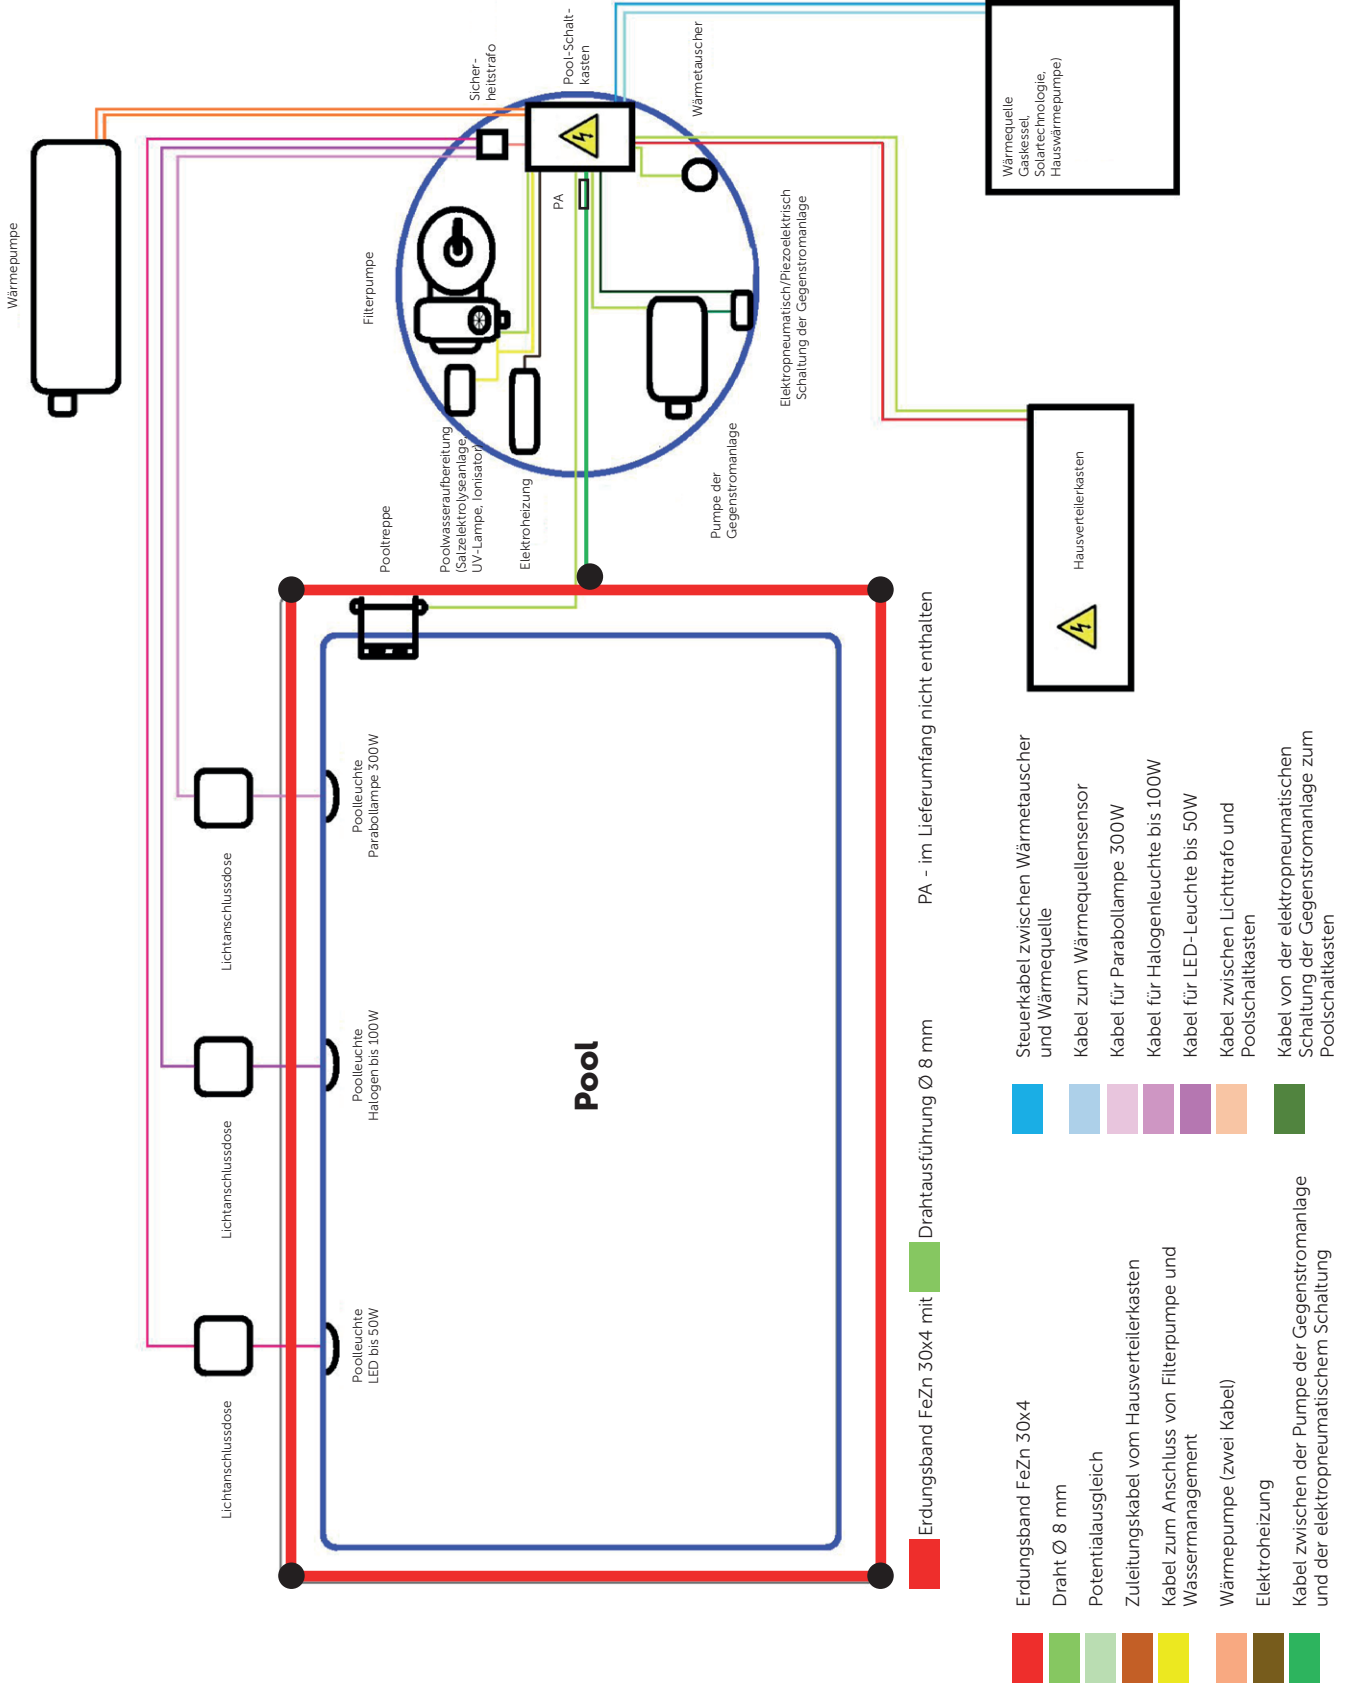



## Filtration; Wärmepumpe XHPFD(PLUS) 60–140 ohne Gegenstromanlage

- Zuleitungskabel CYKY 3 J x 4 + CY 6 gelbgrün (Potentialausgleich, nachfolgend kurz PA) einschließlich Schutzschalter mit 30 mA Reststrom
- Zuleitungskabel-Schutzschalter 20A/1/B
- Haus-Hauptschutzschalter 25A/3/B

## Filtration; Wärmepumpe XHPFD(PLUS) 60–140 mit Gegenstromanlage

- Zuleitungskabel CYKY 5 J x 4 + CY 6 gelbgrün (Potentialausgleich, nachfolgend kurz PA) einschließlich Schutzschalter mit 30 mA Reststrom
- Zuleitungskabel-Schutzschalter 20A/3/B
- Haus-Hauptschutzschalter 25A/3/B

## Filtration; Wärmepumpe XHPFD(PLUS) 160–200tri mit Gegenstromanlage

- Zuleitungskabel CYKY 5 J x 6 + CY 6 gelbgrün (PA) einschließlich Schutzschalter mit 30 mA Reststrom
- Zuleitungskabel-Schutzschalter 25A/3/B
- Haus-Hauptschutzschalter 32A/3/B

## Filtration; Wärmepumpe XHPFDPLUS 20 mit Gegenstromanlage

- Zuleitungskabel CYKY 5 J x 6 + CY 6 gelbgrün (PA) einschließlich Schutzschalter mit 30 mA Reststrom
- Zuleitungskabel-Schutzschalter 40A/3/B
- Haus-Hauptschutzschalter 50A/3/B

Die aufgeführten Querschnitte der Zuleitungskabel empfehlen sich für eine Distanz von bis zu 25 m zwischen Pool und Hausverteiler. Bei größeren Distanzen muss der Querschnitt der Zuleitung entsprechend erhöht werden.

Das Zuleitungskabel vom hausverteilerkasten zum Technikschaft muss vom kunden vor der Lieferung der bestellten Komponenten verlegt werden. Der Lieferant führt das Verlegen des zuleitungskabels vom hausverteilerkasten zum Technikschaft nicht durch. Das Zuleitungskabel muss überprüft werden, um mit dem Technikschaft verbunden zu werden. Die prüfung des zuleitungskabels wird nicht vom lieferanten durchgeführt. Um das Versorgungskabel an den Pooltechnik-Verteiler anschließen zu können, muss es an der Anschlussstelle eine Länge von mindestens 1,5 m haben.

## Kabel für Pumpe der Gegenstromanlage

- Kabel von der Pumpe der Gegenstromanlage zur elektropneumatischen Schaltung CYSY 5 J x 1,5
- Kabel für PA der Pumpe der Gegenstromanlage CYA 6 gelbgrün
- Kabel von der elektropneumatischen Schaltung der Gegenstromanlage zum Poolschaltkasten CYKY 5 J x 2,5
- Schutzschalter im Poolschaltkasten 10A/3/C

## Kabel für Filterpumpe ohne Poolwasseraufbereitung (Salzelektrolyse-Anlage, UV-Lampe, Ionisator)

- Kabel von der Filterpumpe zum Poolschaltkasten CYKY 3 J x 1,5
- Schutzschalter im Poolschaltkasten 4A/1/C

## Kabel für Filterpumpe mit Poolwasseraufbereitung (Salzelektrolyse-Anlage, UV-Lampe, Ionisator)

- Kabel von der Filterpumpe und Poolwasseraufbereitung zum Poolschaltkasten CYKY 3 J x 1,5
- Schutzschalter im Poolschaltkasten 6A/1/C

## Kabel für Poolleuchten

- Kabel zwischen Leuchte bis 50W und Lichttrafo CYKY 3 J x 2,5
- Kabel zwischen Leuchte bis 100W und Lichttrafo CYKY 2 J x 4
- Kabel zwischen Leuchte 300W und Lichttrafo CYKY 2 J x 6
- Schutzschalter im Poolschaltkasten für den Lichttrafo wird anhand der endgültigen Summe der Werte (W) der Leuchten bestimmt

### Kabel für Wärmepumpe XHPFD(PLUS) 60–140

- Kabel zwischen Wärmepumpe und Poolschaltkasten CYKY 3 J x 2,5
- Schutzschalter im Poolschaltkasten 20A/1/C

### Kabel für Wärmepumpe XHPFD(PLUS)160

- Kabel zwischen Wärmepumpe und Poolschaltkasten CYKY 3 J x 4
- Schutzschalter im Poolschaltkasten 20A/1/C

### Kabel für Wärmepumpe XHP/XHPFD 200

- Kabel zwischen Wärmepumpe und Poolschaltkasten CYKY 3 J x 6
- Schutzschalter im Poolschaltkasten 32A/1/C

Die Installation erfordert eine Änderung der Verkabelung der Albixon-Schacht-/Wandschalttafel. Wir empfehlen eine individuelle Beratung durch einen Elektriker.

### Kabel für Wärmepumpe XHP/XHPFD 200 tri

- Kabel zwischen Wärmepumpe und Poolschaltkasten CYKY 5 J x 2,5
- Schutzschalter im Poolschaltkasten 16A/1/C

Die Installation erfordert eine Änderung der Verkabelung der Albixon-Schacht-/Wandschalttafel. Wir empfehlen eine individuelle Beratung durch einen Elektriker.

### Kabel für Wärmetauscher

Das Kabel zum Temperatursensor zwischen Poolschaltkasten und Wärmequelle wird vom Hersteller der Wärmequelle bereitgestellt. Das Steuerkabel zur Wärmequelle ist CYKY 5 J x 1,5. Der Wärmetauscher muss an den Potentialausgleich (PA) angeschlossen werden.

### Kabel für Elektroheizung

- Kabel für 3kW Heizung CYSY 5 J x 2,5 und Schutzschalter im Poolschaltkasten 10A/3/B
- Kabel für 6kW Heizung CYSY 5 J x 2,5 und Schutzschalter im Poolschaltkasten 16A/3/B
- Kabel für 9kW Heizung CYSY 5 J x 2,5 und Schutzschalter im Poolschaltkasten 20A/3/B
- Kabel für 12kW Heizung CYSY 5 J x 2,5 und Schutzschalter im Poolschaltkasten 25A/3/B
- Kabel für 15kW Heizung CYSY 5 J x 4 und Schutzschalter im Poolschaltkasten 32A/3/B
- Kabel für 18kW Heizung CYSY 5 J x 6 und Schutzschalter im Poolschaltkasten 32A/3/B

### Metallteile

In der Pooltechnologie müssen alle Metallteile an PA CYA 6 oder CY 6 gelbgrün angeschlossen werden

### Metall-Pooltreppe und andere Metallkomponenten

Bei der Installation von Metalltreppe und anderen Metallkomponenten muss der Anschluss an PA CYA oder CY 6 gelbgrün erfolgen, jedoch immer gemäß den entsprechenden Anweisungen für das jeweilige Zubehör.


### SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen, den Stromversorgungskreis der Pooltechnologie mit einer Auslösespule mit Sonde zu schützen, die den Stromversorgungskreis trennt, wenn der Schacht mit Wasser geflutet ist (bis zu max. 10 cm).

#### Hinweise

Denken Sie bei der Bauvorbereitung an die zukünftige Entwicklung Ihres neuen Pools oder der Technik. Wenn Sie ein Stromkabel oder andere Netze an den Pool anschließen, überlegen Sie, ob Sie auch ein Netzkabel anschließen sollten, um Ihre Technik besser zu vernetzen, oder ob Sie die notwendigen Vorbereitungen für einen Wärmetauscher, ein automatisches Nachfüllen oder ähnliches Zubehör treffen sollten, dessen Installation in Zukunft Eingriffe in Ihrem Garten bedeuten würde. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Ihren Pool auf eine der oben genannten Weisen erweitern werden, aber nichts unterschätzen wollen, sollten Sie mindestens ein zusätzliches Schutzrohr zum Pool verlegen, das Sie in Zukunft für diese Netze verwenden können.


Der Wert des Leistungsschalters der Pool-Schaltanlage (FI1) sollte mit dem Leistungsschalter der Zuleitung im Hausschaltschrank übereinstimmen.

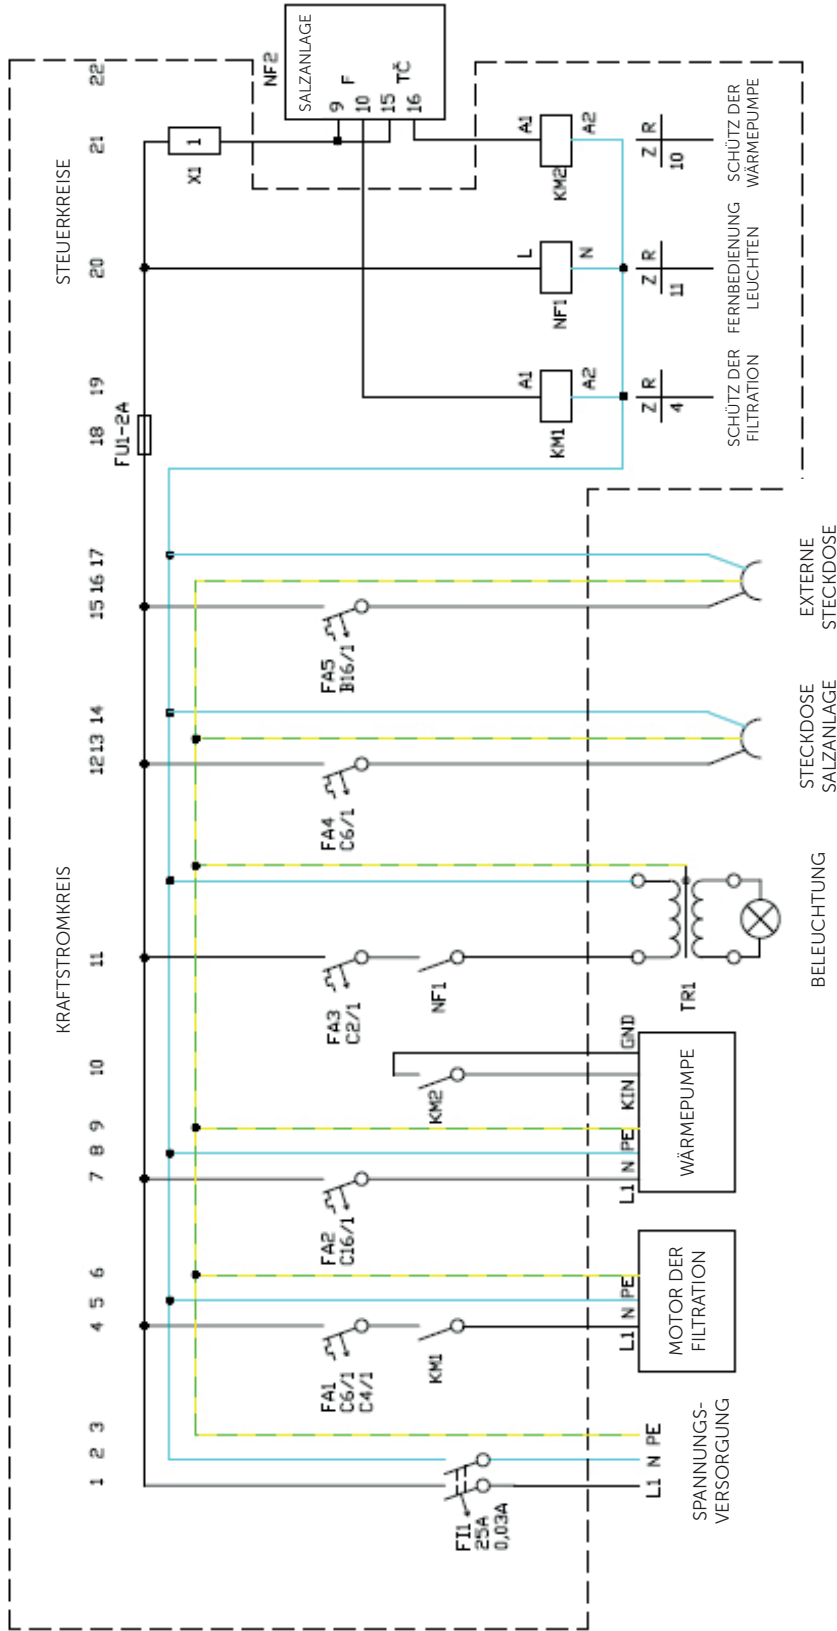

## Gerät mit Programm-Salzanlage


- Legende
- FI1 - Stromschutzschalter 25/4/0,03
  - FA1 - Schutzschalter der Filtration entsprechend der Pumpenleistung C6/1, C4/1
  - KM1 - Filtrationsschutz
  - FA2 - Schutzschalter der Wärmepumpe C16/1
  - KM2 - Schutz der Wärmepumpe
  - FA3 - Schutzschalter des Gegenstroms C2/1
  - FA4 - Schutzschalter des Beleuchtungstransformators C6/1
  - TR1 - Sicherheitstransformator 230V/12V
  - FU1 - Sicherungseinsatz 2A
  - NF1 - Fernbedienung der Beleuchtung
  - NF2 - Steuerung von Salzanlage
  - FA5 - Schutzschalter der Steckdose - Salzanlage B16/1
  - X1-1 Klemme der Stromversorgung Salzanlage

Gezeichnet von: Jiří Uhr	Datum: 20.9.2016	Bezeichnung: Schaltanlage AO-2-E	
Überprüft von: Jindřich Sobotka	Datum: 22.9.2016		
Freigegeben von: Daniel Rychvalský	Datum: 23.9.2016	Typ: F/SD/TC/P/NaCl	
<b>ALBIXON a.s.</b>		Anzahl der Blätter: 1	Blatt Nummer: 1
		Aktualisierung: 3.3.2020	

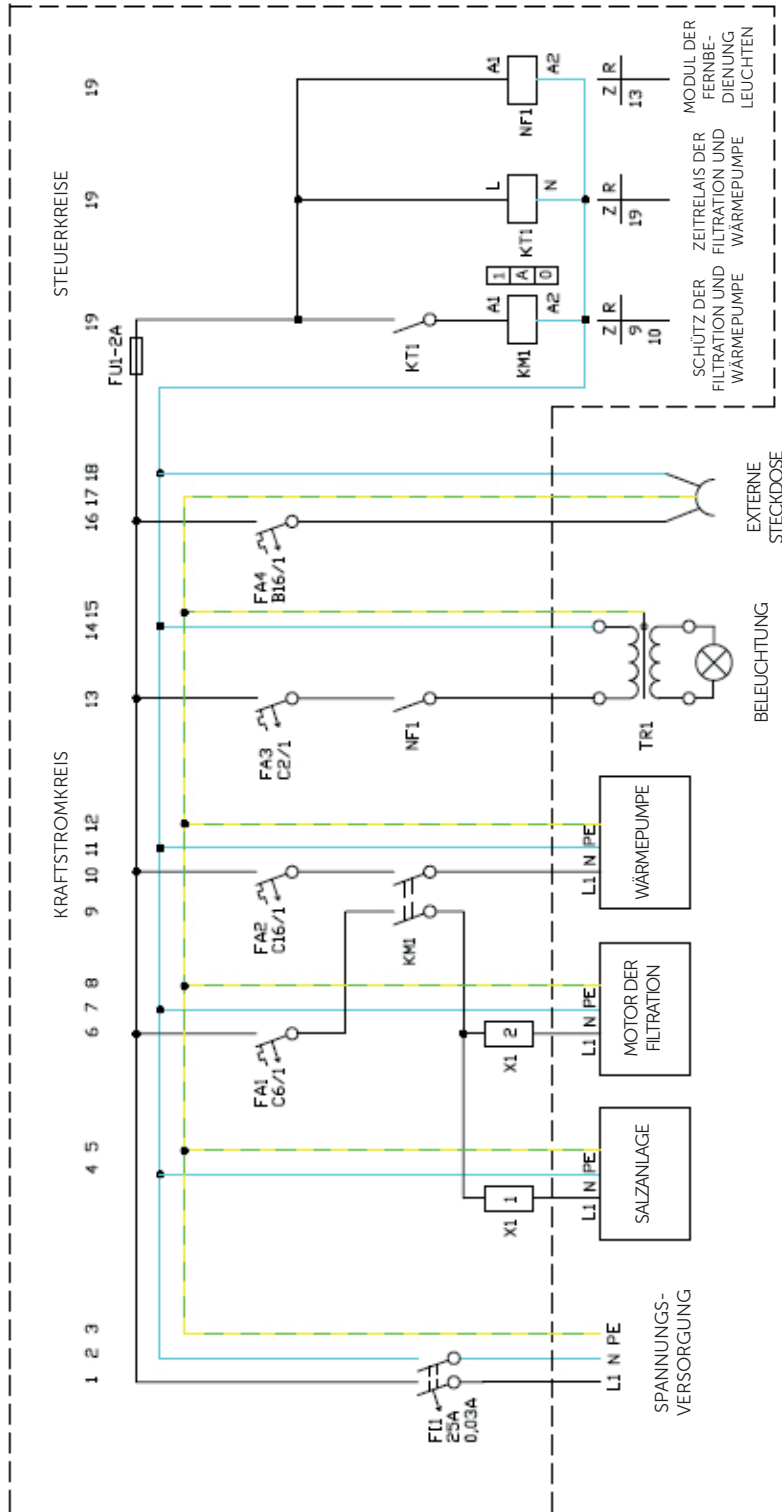

- Legende
- FI1 - Stromschutzschalter 25/2/0,03
  - FA1 - Schutzschalter der Filtration entsprechend der Pumpenleistung C6/1
  - KM1 - Schutz der Salzanlage und Filtration
  - FA2 - Schutzschalter der Wärmepumpe C16/1
  - FA3 - Schutzschalter des Beleuchtungstransformators C2/1
  - FA4 - Schutzschalter externer Steckdose B16/1
  - TR1 - Sicherheitstransformator 230V/12V
  - FU1 - Sicherungseinsatz 2A
  - KT1 - Zeitschaltuhr des Relais der Filtration und Wärmepumpe
  - NF1 - Fernbedienung der Beleuchtung
  - X1-1 Klemme der Stromversorgung Salzanlage
  - X1-2 Stromversorgungsklemme Motor der Filtration


Gezeichnet von: Jiří Uhr	Datum: 22.9.2016	Bezeichnung: Schaltanlage AO-1 a
Überprüft von: Jindřich Sobotka	Datum: 25.9.2016	
Freigegeben von: Daniel Rychvalský	Datum: 26.9.2016	
<b>ALBIXON a.s.</b>		Typ: F/SD/TČ/P/NaCl
Aktualisierung: 4.3.2020	Anzahl der Blätter: 1	Blatt Nummer: 1

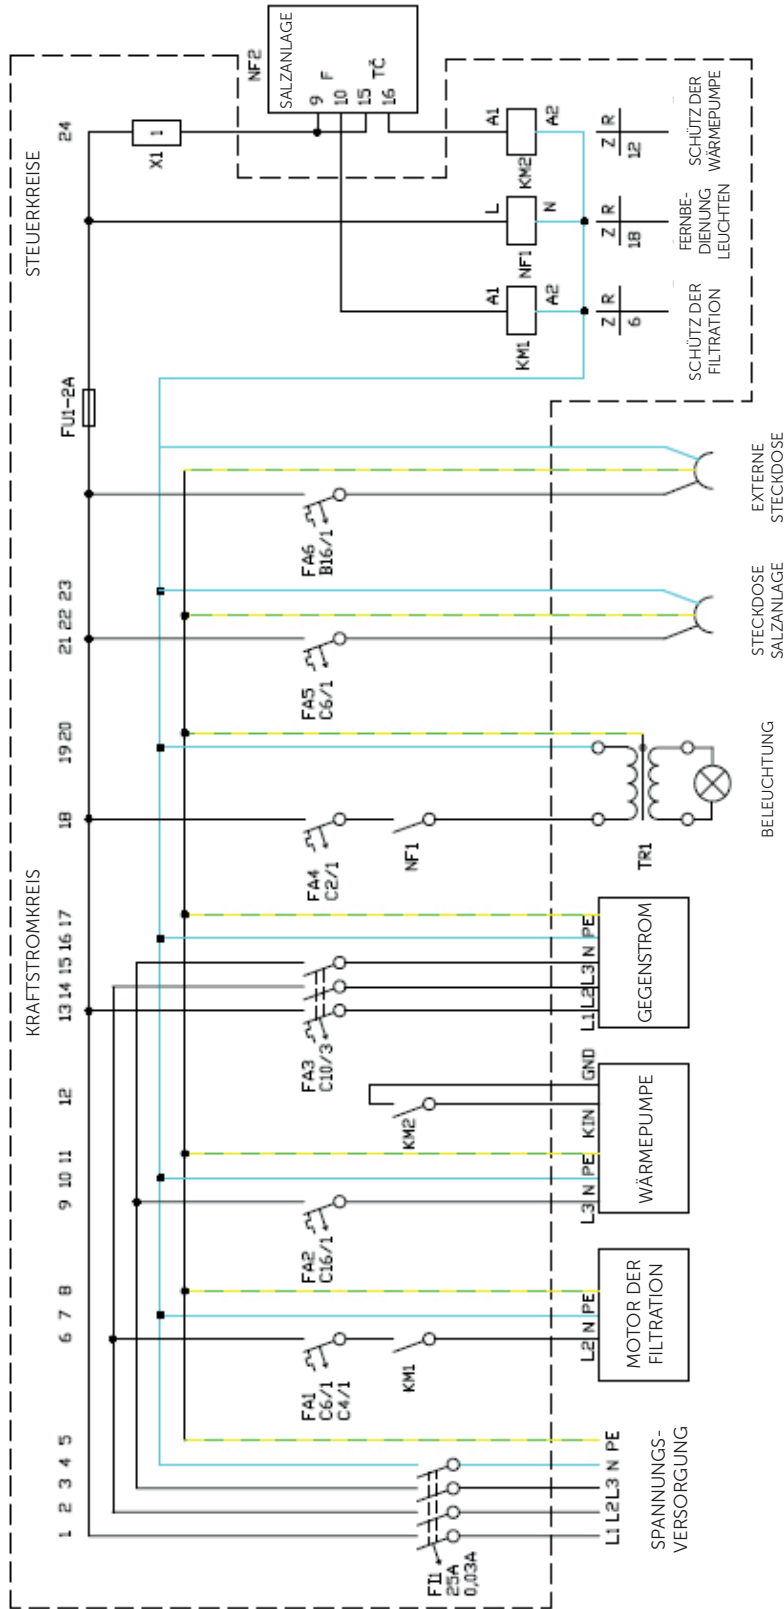

## Gerät mit Programm-Salzanlage

- Legende
- FI1 - Stromschuttschalter 25/4/0,03
  - FA1 - Schuttschalter der Filtration entsprechend der Pumpenleistung C6/1, C4/1
  - KM1 - Filtrationsschutz
  - FA2 - Schuttschalter der Wärmepumpe C16/1
  - FA3 - Schuttschalter des Gegenstroms C10/3
  - KM2 - Schutz der Wärmepumpe
  - FA4 - Schuttschalter des Beleuchtungstransformators C2/1
  - FA5 - Schuttschalter der Steckdose - Salzanlage C6/1
  - TR1 - Sicherungstransformator 230V/12V
  - FU1 - Sicherungseinsatz 2A
  - NF1 - Fernbedienung der Beleuchtung
  - NF2 - Steuerung von Salzanlage
  - FA6 - Schuttschalter Steckdose extern B16/1
  - X1 - Klemme der Stromversorgung Salzanlage

Gezeichnet von: Jiří Ungr	Datum: 20.9.2016	Bezeichnung: Schaltanlage AO-2-D	
Überprüft von: Jindřich Sobotka	Datum: 22.9.2016		
Freigegeben von: Daniel Rychvalský	Datum: 23.9.2016	Typ: F/SD/TČ/P/NaCl	
<b>ALBIXON a. s.</b>		Anzahl der Blätter: 1	Blatt Nummer: 1
		Aktualisierung: 3.3.2020	

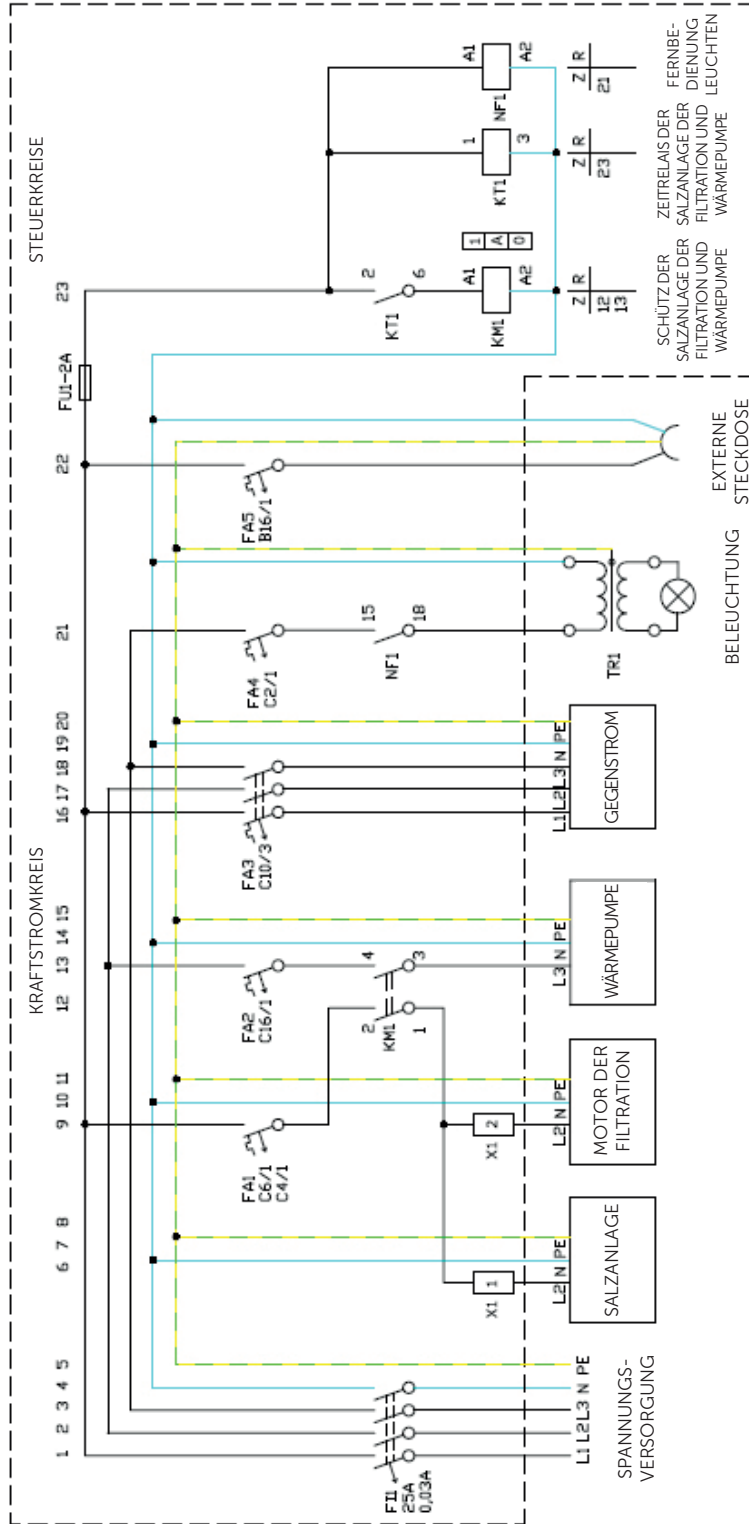

### Legende

- FI1 - Stromschutzschalter 25/4/0,03
- FA1 - Schutzschalter der Filtration entsprechend der Pumpenleistung C6/1, C4/1
- KML1 - Schütz der Filtration, Salzanlage und Wärmepumpe
- FA2 - Schutzschalter der Wärmepumpe C16/1
- FA3 - Schutzschalter des Gegenstroms C10/3
- FA4 - Schutzschalter des Beleuchtungstransformators C2/1
- FA5 - Sichertheitsstromtransformator 230V/12V
- FU1 - Sichertheitssteckdose extern B16/1
- FU1 - Sicherungseinsatz 2A
- KML1 - Schütz der Filtration, Salzanlage und Wärmepumpe
- KTI1 - Zeitschaltuhr des Relais der Salzanlage, Filtration und Wärmepumpe
- NF1 - Fernbedienung der Beleuchtung
- X1-1, Klemme der Stromversorgung Salzanlage
- X1-2 Stromversorgungsklemme Motor der Filtration

Gezeichnet von: Jiri Ungr	Datum: 20.9.2016	Bezeichnung: Schaltanlage AO-2-C	
Überprüft von: Jindřich Sobotka	Datum: 22.9.2016		
Freigegeben von: Daniel Rychvalský	Datum: 23.9.2016	Typ: F/SD/TC/P/NaCl	
<b>ALBIXON a. s.</b>		Anzahl der Blätter: 1	Blatt Nummer: 1
		Aktualisierung: 5.3.2020	

## Weitere detaillierte Informationen finden Sie auch hier:

---


### 1. Allgemeine Vertragsbedingungen

- <https://www.albixon.cz/vsp>



### 2. Reklamationsbedingungen

- <https://www.albixon.cz/reklamacni-rad/>





Vielen Dank, dass Sie  
die Produkte von  
ALBIXON verwenden



**ALBIXON**

Callcenter: 477 07 07 11  
[www.ALBIXON.de](http://www.ALBIXON.de)

In dieser Anleitung werden illustrative Fotos verwendet. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
